



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N° 215 – Técnico. O. P. M
Guaranda, 21/03/2022

Ingeniero.

WILIAN MANOBANDA

Director de Obras Públicas Municipales

Presente.-

De mi consideración:

En atención al **OFICIO N° 0241-DOP-GADCG-22**, en el cual me nombran como fiscalizado por medio de esto le informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución: "CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LA PRENSA SECTOR JUAN XXIII", el cual se encuentra ubicado en la Av. La Prensa sector Juan XXIII.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: Sr. Vallejo Toalombo Segundo Alfredo

Orden de Trabajo N°: 01-DOP-GADCG

Fecha de suscripción: 10 de Marzo del 2022

Monto del Presupuesto: \$ 4427.42 USD incluye IVA

Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo

Porcentaje del anticipo %: 0

Plazo: 10 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 18 de marzo del 2022

Días Trabajados: 8 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Sr. Vallejo Toalombo Segundo Alfredo, cuya liquidación es de **\$3953.05** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO O. P. MUNICIPAL



HORA 10:35 28 MAR 2022

FIRMA





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA												
		PLANILLA: OBRA:	LIQUIDACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LA PRENSA SECTOR JUAN XXIII	PERIODO: 2022-MARZO	MONTOS DE PLANILLA:		3953.05							
UBICACIÓN: MONTOS DE OBRA		AV. LA PRENSA, SECTOR JUAN XXIII		PROCESO:		MANO DE OBRA		FECHA DE INICIO:		FECHA DE CONTRATO:		TRABAJO POR DESTAJO		
		3953.11		VALLEJO TOLAMBO SEGUNDO ALFREDO		AMPLIACIÓN DE PLAZO:		CONTRA ENTREGA:		10-mar-22		OBSERVACIONES		
RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			IMPORTE			TOTAL A LA FECHA	PRESTIPUESTO	% A LA FECHA	OBSERVACIONES	
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO					
1	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0.2m	M3	11.19	6.24		6.85	6.85		76.65	69.83				
2	HORMIGÓN CICLOPEO CON ENCOFRADO f _c 180 kg/cm ²	M3	152.65	10.30		4.74	4.74		723.56	1572.30				
3	ACERO DE REFUERZO f _y = 4200 kg/cm ²	KG	2.04	136.80		135.73	135.73		276.89	279.07				
4	HORMIGÓN s. f _c = 210 kg/cm ² EN MULOS INC. ENCOFRADO, CON DRENAJE	M3	225.19	10.61		11.89	11.89		2677.51	2389.27				
5	RELLENO COMPACTADO MANUAL (PISON)	M3	10.21	14.00		13.39	13.39		136.71	142.94				
6	COLOCACION ADOQUIN DE COLOR PEATONAL	M2	4.14	23.00		14.91	14.91		61.73	95.22				
				TOTALES			3953.05			3953.05			4548.62	
				ANTICIPO:			0%			0				
				MULTAS:			0%			0				
				RET. FUENTE:			0%			3953.05			3953.05	
				VALOR ESTA PLANILLA			IVA			474.37			474.37	
				CONTRATISTA			SR SEGUNDO VALLEJO			4427.42			4427.42	
DIRECTOR DE O.O.P.P.M		FISCALIZADOR												
ING. WILLIAM MANOABANDA		ING. ELIZABETH INGA												




DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA							 Guaranda ALCALDÍA			
OBRA:	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LA PRENSA SECTOR JUAN XXIII									
UBICACION:	AV. LA PRENSA; SECTOR JUAN XXIII									
RUBROS:	MEDIDAS (M)				VOLUMENES		Total	Observaciones		
	Largo	Ancho	Alto	#	Parcial	Subtotal				
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0.2m	22.50	0.50	0.50	1.00	5.63	5.63	6.85			
	0.70	0.50	0.50	7.00	0.18	1.23				
HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 180 kg cm ²	2.80	0.28	0.50	2.00	0.39	0.77	4.74			
	3.00	0.28	0.50	4.00	0.41	1.65				
	3.55	0.28	0.40	2.00	0.39	0.78				
	3.50	0.28	0.40	4.00	0.39	1.54				
HORMIGON S. f'c=210 kg cm ² EN MUROS INC. ENCOFRADO; CON DRENAJE	3.55	0.28	1.50	2.00	1.46	2.93	11.89			
	3.50	0.28	1.50	4.00	1.44	5.78				
	0.70	0.50	1.00	7.00	0.35	2.45				
	0.20	0.28	1.90	7.00	0.10	0.73				
RELLENO COMPACTADO MANUAL (PIZON)	22.50	0.35	1.70	1.00	13.39	13.39	13.39			
COLOCACIÓN ADOQUIN DE COLOR PEATONAL	3.55	0.70	-	1.00	2.49	2.49	14.91			
	2.60	0.80	-	1.00	2.08	2.08				
	3.20	0.90	-	1.00	2.88	2.88				
	5.40	0.80	-	1.00	4.32	4.32				
	3.85	0.70	-	1.00	2.70	2.70				
	1.50	0.30	-	1.00	0.45	0.45				
	a (m)	gancho(m)	# varillas	#	Parcial	Subtotal	Total	Peso (kg m)	Peso (kg)	Peso Total (kg)
ACERO DE REFUERZO f _y = 4200 kg cm ² (8MM)	0.60	0.10	15.00	7.00	10.50	73.50	100.50	0.40	40.20	135.73
	0.15	0.10	18.00	6.00	4.50	27.00				
ACERO DE REFUERZO f _y = 4200 kg cm ² (10MM)	2.80	0.20	4.00	7.00	12.00	84.00	154.08	0.62	95.55	
	11.55	0.15	-	6.00	11.65	70.05				
 FISCALIZADOR ING. ELIZABETH INGA							 CONTRATISTA SR. SEGUNDO VALLEJO			




DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RESPALDO FOTOGRAFICO

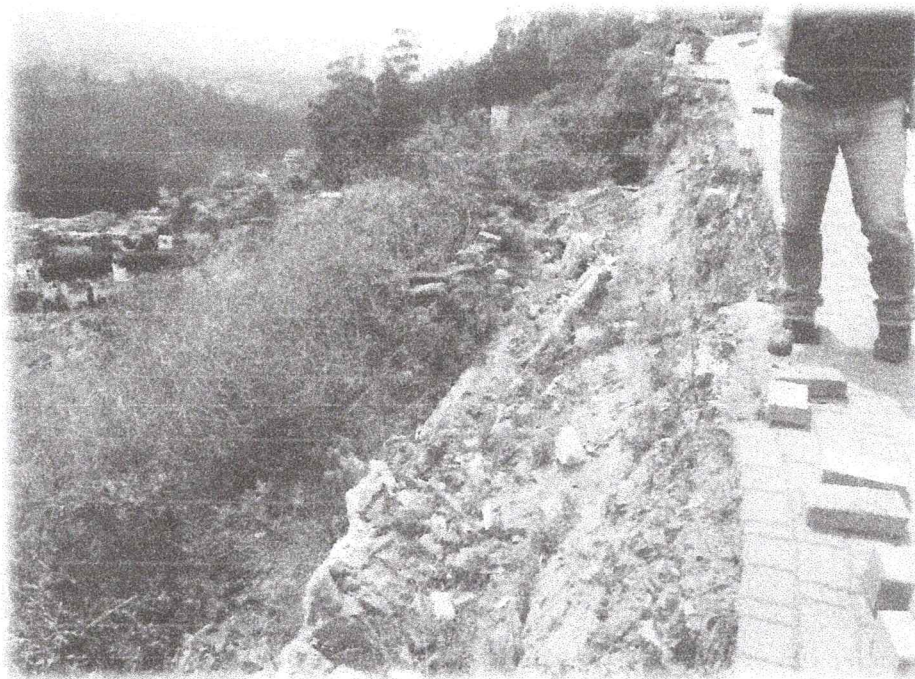

COMO SE ENCONTRO LA OBRA

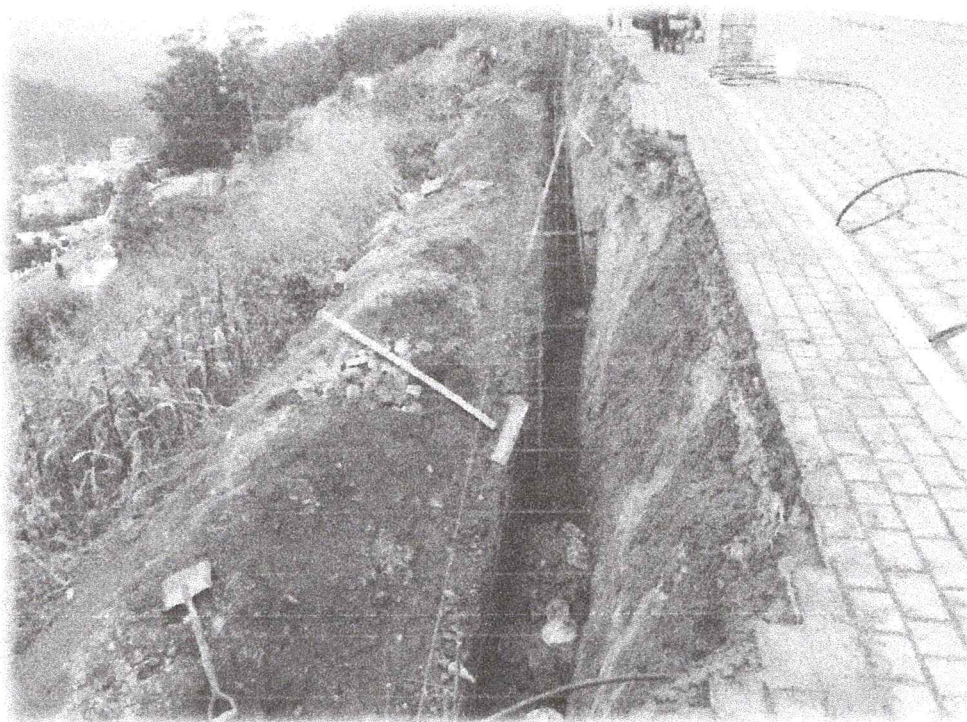

EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PLINTOS

Don [illegible]




Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) - 551088 - 551089



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS



ARMADO DE COLUMNAS CON ACERO DE REFUERZO

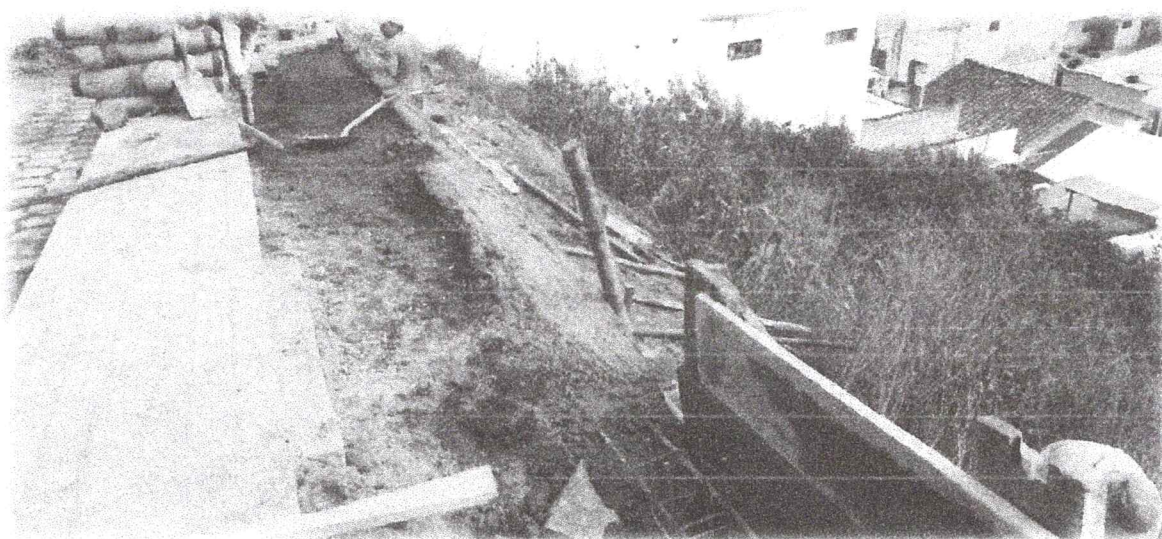

FUNDICIÓN DE MURO, ENCOFRADO, RELLENO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN ORNAMENTAL





**DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ÍNFIMA CUANTÍA**

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, “CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LA PRENSA SECTOR JUAN XXIII”, entregado por el Sr. VALLEJO TOALOMBO SEGUNDO ALFREDO, previo orden de trabajo N° 01-DOP-GADCG, de fecha 10 de marzo de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ING. WILIAM MANOBANDA.

En la ciudad de Guaranda a los 21 días del mes de marzo del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. WILIAM MANOBANDA, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. Vallejo Toalombo Segundo Alfredo para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LA PRENSA SECTOR JUAN XXIII”; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m	M3	11.19	6.85	76.65
2	HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f _c 180 kg/cm ²	M3	152.65	4.74	723.56
3	ACERO DE REFUERZO f _y = 4200 kg/cm ²	KG	2.04	135.73	276.89
4	HORMIGON S. f _c =210 kg/cm ² EN MUROS INC. ENCOFRADO; CON DRENAJE	M3	225.19	11.89	2677.51
5	RELLENO COMPACTADO MANUAL (PIZON)	M3	10.21	13.39	136.71
6	COLOCACIÓN ADOQUIN DE COLOR PEATONAL	M2	4.14	14.91	61.73
TOTAL PARCIAL					3953.05
IVA 12%					474.37
TOTAL					4427.42

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 10 de Marzo del 2022

Plazo: 10 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 18 de marzo del 2022

Días Trabajados: 8 días, no existe mora

Dir. Guaranda, 10 de marzo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, "CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LA PRENSA SECTOR JUAN XXIII".

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, "CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LA PRENSA SECTOR JUAN XXIII", hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,


Ing. Wiliam Manobanda
DIRECTOR DE OO.PP.MM


Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO OO.PP.MM


Sr. Vallejo Toalombo Segundo Alfredo
CONTRATISTA

