

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Solicitud de Pago No. 065-DOP-GADCG
Guaranda, 04 de agosto 2022

Ingeniero
Alex Cordero
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

En base a la documentación adjunta, e informe presentado por la Ing. Elizabeth Inga, Fiscalizador de Obra; agradeceré a usted disponer a quien corresponda realizar el proceso de pago por el monto de **CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES 53/100 CTV (USD. 5,917.53) MAS IVA**, a favor del Sr. **ÁNGEL SEGUNDO AUCATOMA MATAVACA**, Contratista de los trabajos de **"ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA, PARROQUIA GUANUJO"**, por concepto de **PLANILLA 1 DE LIQUIDACIÓN**.


Particular que solicito para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Alex Fabián Vásquez Ch.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

FV/LB





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N°385 – Técnica. E. I – GADCG
Guaranda, 04/08/2022

Ingeniero.
ALEX FABIAN VASCONEZ
Director de Obras Públicas Municipales

[Firma]
04/08/2022

Presente.-

De mi consideración:

En atención al **OFICIO 0761 – DOP – GAGDCG – 22**, emitido el 18 de julio del 2022 donde me designa como FISCALIZADORA el Ing. Galo Patín Director de Obras Públicas Encargado por lo tanto, informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución:

'ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA, el cual se encuentra ubicado en la parroquia Guanujo, sector del Estadio, calle Feliza Eguez y Manuel Paliz.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista: Sr. Angel Aucatoma Matavaca
Orden de Trabajo N°: N.º 11-DOP-GADCG
Fecha de suscripción: 18 de julio del 2022
Monto del Presupuesto: \$ 6627.64 USD incluye IVA
Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo
Porcentaje del anticipo %: 0
Plazo: 15 días a partir de la Orden de Trabajo
Oficio de terminación de Trabajos: 01 de agosto del 2022
Días Trabajados: 15 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Sr. Angel Aucatoma Matavaca, cuya liquidación es de **\$5917.53** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Correspondiente a la Certificación Presupuestaria No: 214, de la partida presupuestaria **00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.**

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,

[Firma]

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA									
PLANILLA:		LIQUIDACIÓN	PERIODO: 2022-(JULIO - AGOSTO)		MONTO DE PLANILLA:		5917.53				5917.53
OBRA:		ADOQUINADO BARRIO MANTILLA									
UBICACIÓN:		PARROQUIA GUANUJO, SECTOR DEL ESTADIO, CALLE FELIZA EGUEZ Y MANUEL PALIZ									
MONTO DE		5917.53		PROCESO:		MANO DE OBRA		FECHA DE INICIO:		18-jul-22	
CONTRATISTA:		SR. ANGEL AUCATOMA MATAVACA									
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES		IMPORTE		PRESUPUESTO		OBSERVACIONES	
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	AMPLIACIÓN DE PLAZO:	% A LA FECHA
1	COLOCACIÓN DE ADOQUIN (MANO DE OBRA)	M2	2.99	2,084.00		1,979.11		5917.53	6231.16		
				TOTALES		5917.53	5917.53	6231.16			
				ANTICIPO: 0%		0	0				
				MULTAS:		0	0				
				RET. FUENTE: 0%		5917.53	5917.53				
				VALOR ESTA PLANILLA		710.10	710.10				
				IVA 12%		6627.64	6627.64				
				LIQUIDO							
FISCALIZADOR		SR. ANGEL AUCATOMA MATAVACA									
ING. ALEX FABIAN VASCONEZ		ING. ELIZABETH INGA									

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

MEMORIA DE CÁLCULO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA								
OBRA:	ADOQUINADO BARRIO MANTILLA							
UBICACIÓN:	PARROQUIA GUANUJO, SECTOR DEL ESTADIO, CALLE FELIZA EGUEZ Y MANUEL PALIZ							
RUBROS:	MEDIDAS (M)			Area (M2)	VOLUMENES		Total	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal		
COLOCACIÓN DE ADOQUIN (MANO DE OBRA)	20.00	7.45		149.00			1979.11	
	20.00	7.75		155.00				
	20.00	7.80		156.00				
	20.00	7.45		149.00				
	5.00	6.90		34.50				
	20.00	6.85		137.00				
	18.00	7.45		134.10				
	2.30	1.08		2.47				
	4.20	1.40		5.88				
	20.00	6.20		124.00				
	20.00	6.60		132.00				
	20.00	6.65		133.00				
	20.00	7.00		140.00				
	20.00	7.70		154.00				
	20.00	8.20		164.00				
	8.50	8.25		70.13				
	20.00	4.30		86.00				
	8.70	4.30		37.41				
	14.20	1.10		15.62				
<div> FISCALIZADOR ING. ELIZABETH INGA</div> <div> CONTRATISTA SR. ANGEL AUCATOMA MATAVACA</div>								

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS


RESPALDO FOTOGRAFICO



FORMA UNO DE LOS TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS



FOTOS OBRA ARREGLOS CALLE 9 DE ABRIL EN GUARANDA

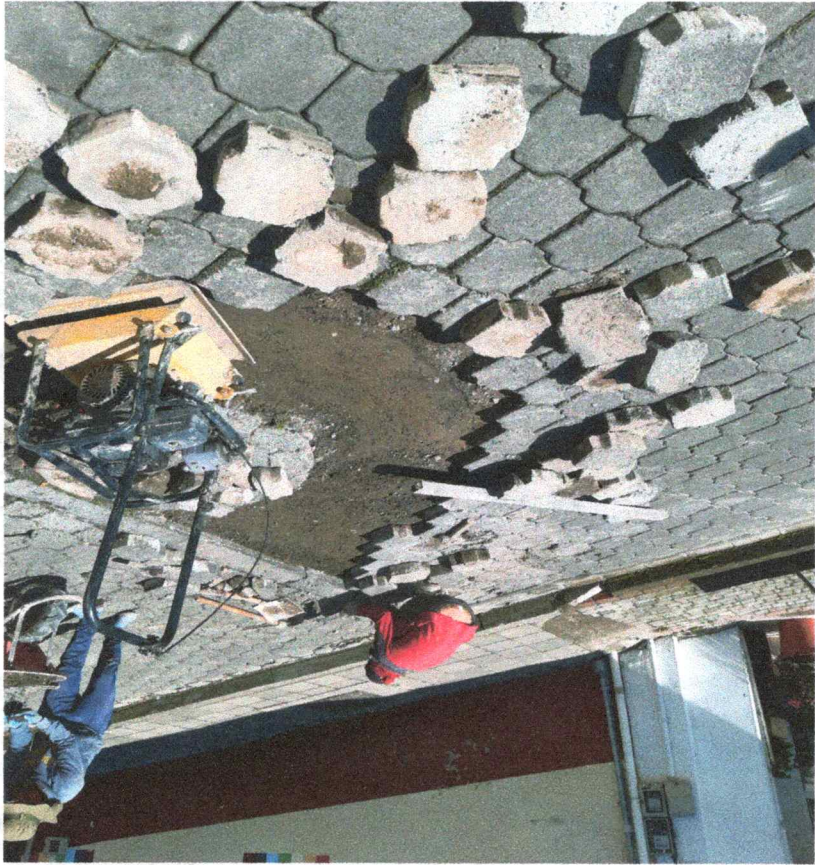

arreglo calle berma y adoquin esquina calle olmedo(FECAB)

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS






DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

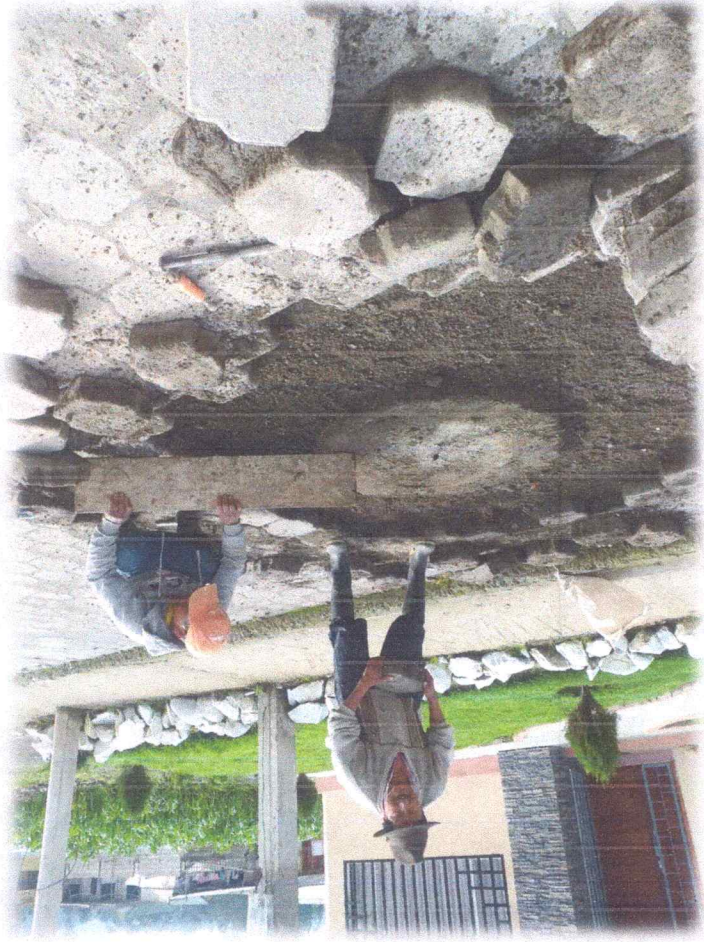

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ÍNFIMA CUANTÍA

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, “**ADOQUINADO BARRIO MANTILLA**”, entregado por el SR. ANGEL AUCATOMA MATAVACA, previo orden de trabajo N.º 11-DOP-GADCG, de fecha 18 de julio de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ENCARGADO ING. GALO PATÍN.

En la ciudad de Guaranda a los 01 días del mes de agosto del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el Ing. Alex Fabián Vasconez, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. Angel Aucatoma Matavaca para el proyecto “**ADOQUINADO BARRIO MANTILLA**”; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	COLOCACIÓN DE ADOQUIN (MANO DE OBRA)	M2	2.99	1979.11	5917.53
TOTAL PARCIAL					5917.53
IVA 12%					710.10
TOTAL					6627.64

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 18 de julio del 2022

Plazo: 15 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 01 de agosto del 2022

Días Trabajados: 15 días, no existe mora

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para la ejecución de la obra se entregó un total de 79.16 m3 de arena, para toda el área contratada con un espesor de cama de área de 4 cm, al Sr. Angel Aucatoma Matavaca ya que el rubro contempla solo **COLOCACIÓN DE ADOQUIN (MANO DE OBRA)**.
- Se debe tomar en cuenta que los adoquines que se colocaron en ese sector son **reutilizados** obtenidos de la Cdla. Las Colinas.

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, “**ADOQUINADO BARRIO MANTILLA**”.

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, “**ADOQUINADO BARRIO MANTILLA**”, hacer las correcciones a su costo.

Guaranda, 01 de agosto del 2022

PARA:
ING. ELIZABETH INGA S
Fiscalizador Municipal

Presente:

De mi consideración:

Con forme a la orden de trabajo suscrito por el Director de Obras Públicas Municipales (E), Ing. Galo Patín, donde usted es nombrado como fiscalizador, le comunico que la obra “**ADOQUINADO BARRIO MANTILLA**” se encuentra terminado, por lo que solicito por vuestro intermedio se haga la planilla única de liquidación y prosiga con el trámite correspondiente para el cobro de la misma.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente:


Sr. Ángel Aucatoma Matavaca
CONTRATISTA

Recibido
01/08/2022




DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,

Ing. Alex Fabián Vasconez
DIRECTOR DE OO.PP.MM

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Sr. Angel Aucatoma Matavaca
CONTRATISTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
AUCATOMA MATAVACA
ANGEL SEGUNDO

LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
GUARANDA
GUANUJO

FECHA DE NACIMIENTO 1964-02-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA ZOILA
AUCATOMA MILAN

Nº 020091063-6





INSTRUCCIÓN BÁSICA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AUCATOMA JOSE

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ALBANIL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MATAVACA MARIA



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUARANDA
2019-04-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-04-09

E334414244

000514222




CERTIFICADO DE VOTACIÓN 11 ABRIL 2021

PROVINCIA: BOLIVAR

CIRCUNSCRIPCIÓN:

CANTON: GUARANDA

PARROQUIA: ANGEL POLIVIO CHAVEZ

ZONA: 3

JUNTA No: 0001 MASCULINO

Nº 67133000

CC Nº 0200910636

AUCATOMA MATAVACA ANGEL SEGUNDO






CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2021

EL PRESIDENTE DE LA JRV






Correo electronico
segundo aucatoma@gmail.com
contraseña
0200910636



LIBRETA DE AHORROS

BanEcuador

0004108699

SUCURSAL

0124

TITULAR

NÚMERO DE CUENTA

EDUCATORA NATAVACA ANGEL SEGUNDO

0-05012702-8

FECHA	TRANSACCION	SALDO	CÓDIGO
1	21/07/2021	30.00	3,733.17 RTCL 9784
2	23/07/2021	1,600.00	2,133.17 RTCL 1204
3	26/07/2021	1,100.00	1,033.17 RTCL 3325
4	29/07/2021	500.00	533.17 RTCL 4305
5	30/07/2021	1.21	534.38 INT 1301
6	11/08/2021	250.00	284.38 RTCL 7490
7			
8	13/08/2021	110.00	174.38 RTCL 6576
9	18/08/2021	20.00	154.38 RTCL 1906
10			
11	31/08/2021	0.24	154.62 INT 8912
12			
13	06/09/2021	50.00	104.62 RTCL 7497
14			
15	06/09/2021	1,000.00	1,104.62 DPCL 5377
16	08/09/2021	400.00	704.62 RTCL 9312
17			
18	17/09/2021	100.00	604.62 RTCL 0303
19			
20			
21			
22	22/09/2021	20.00	584.62 RTCL 2108
23			
24			

VERIFICAR QUE LOS REGISTROS ESTÉN DE ACUERDO CON LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

DPCL - DEPÓSITO CON LIBRETA
DPCL - DEPÓSITO AHORROS S/L
NCCL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS SIN LIBRETA
NCCL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS CON LIBRETA
RTCL - RETIRO DE AHORROS CON LIBRETA
NDCL - NOTA DE DÉBITO CON LIBRETA
AH-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-AH
CT-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CT-AH

RESL - RETIRO AHORROS SIN LIBRETA
NDCL - N/D NOTA DE DÉBITO AHORROS S/L
INT - INTERÉS
RETE - RETENCIÓN
CORR - REVERSO TRANSACCIÓN MOVIMIENTO
CIAH - SALDO AL CIERRE
AH-CT - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-CT

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0200910636001

APELLIDOS Y NOMBRES: AUCATOMA MATAVACA ANGEL SEGUNDO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 10/02/1964

FEC. ACTUALIZACION: 25/11/2014

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/01/2002

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 15/01/2002

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: BOLIVAR Cantón: GUARANDA Parroquia: GUANUJO Referencia: COMUNIDAD SAN JUAN LLULLUNDONGO, A DOS CUADRAS DEL SUBCENTRO DE SALUD, VIA A GUANTOCRUZ Email: angel.aucatoma0200@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE).

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.


DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: ZONA 5 BOLIVAR

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JCVG060314

Lugar de emisión: GUARANDA/GARCIA MORENO Fecha y hora: 25/11/2014 16:04:48

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0200910636001

APELLIDOS Y NOMBRES: AUCATOMA MATAVACA ANGEL SEGUNDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 15/01/2002

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION


CULTIVO DE PATATAS

CULTIVO DE MORA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: BOLIVAR Cantón: GUARANDA Parroquia: GUANUJO Barrio: COMUNIDAD SANJUAN LLULLUNDONGO Referencia: A
DOS CUADRAS DEL SUBCENTRO DE SALUD Camino: A GUANTOCRUZ Celular: 0959697274 Email:
angel.aucatoma0200@gmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JCVG060314

Lugar de emisión: GUARANDA/GARCIA MORENO Fecha y hora: 25/11/2014 16:04:46



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE TRABAJO N.º 11-DOP-GADCG

Guaranda, 18 de julio de 2022

Señor
Ángel Aucatoma Matavaca
CONTRATISTA DEL GADCG
Presente. -

En vista de que es necesario realizar los trabajos de adoquinado en el barrio Mantilla, tramos de las calles Felisa Egüéz y Manuel Paliz, para lo cual se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente mucho agradeceré se sirva iniciar los trabajos correspondientes a esta obra, para lo que adjunto una copia del presupuesto que asciende a la cantidad de USD 6,231.16 dólares sin IVA, siendo la fiscalizadora la Ing. Elizabeth Inga con quien deberá coordinar el inicio de los trabajos y las instrucciones técnicas.

PLAZO Y FORMA DE PAGO

El plazo máximo para la ejecución de la obra descrita en el presente documento será de 15 días, contados a partir de la notificación del presente documento.

La forma de pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Guaranda, a través de la Dirección de Obras Públicas.

Se pagará el valor total de los trabajos una vez finalizada y entregada a satisfacción de la Entidad Contratante (Contra Entrega).

MULTAS

Para el caso en que el Contratista no entregare los trabajos en los plazos estipulados, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1 /1000), del monto total del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme lo define el artículo 30 del Código Civil.

Los valores de las multas serán deducidos del valor del pago correspondiente.

Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo las correcciones que aparecieren en la obra, durante el periodo comprendido de tres meses después de la suscripción del acta única de entrega.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Ing. Galo Patin
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ENCARGADO
GP/MAS

Recivido 78 de Julio 2022


Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE TRABAJO N.º 11-DOP-GADCG

Guaranda, 18 de julio de 2022

Señor
Ángel Aucatoma Matavaca
CONTRATISTA DEL GADCG
Presente. -

En vista de que es necesario realizar los trabajos de adoquinado en el barrio Mantilla, tramos de las calles Felisa Egüéz y Manuel Paliz, para lo cual se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente mucho agradeceré se sirva iniciar los trabajos correspondientes a esta obra, para lo que adjunto una copia del presupuesto que asciende a la cantidad de USD 6,231.16 dólares sin IVA, siendo la fiscalizadora la Ing. Elizabeth Inga con quien deberá coordinar el inicio de los trabajos y las instrucciones técnicas.

PLAZO Y FORMA DE PAGO

El plazo máximo para la ejecución de la obra descrita en el presente documento será de 15 días, contados a partir de la notificación del presente documento.

La forma de pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Guaranda, a través de la Dirección de Obras Públicas.

Se pagará el valor total de los trabajos una vez finalizada y entregada a satisfacción de la Entidad Contratante (Contra Entrega).

MULTAS

Para el caso en que el Contratista no entregare los trabajos en los plazos estipulados, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1 /1000), del monto total del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme lo define el artículo 30 del Código Civil.

Los valores de las multas serán deducidos del valor del pago correspondiente.

Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo las correcciones que aparecieren en la obra, durante el periodo comprendido de tres meses después de la suscripción del acta única de entrega.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Ing. Galo Patin
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ENCARGADO
GP/MAS

Por Guaranda yo me sumo



*Reservado 18 de Julio
2022*


Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio 0761-DOP-GADCG-22
Guaranda, 18 de julio 2022

Ingeniera
Elizabeth Inga
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Presente.-


Por medio del presente se designa a usted como fiscalizador del Proyecto **ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA**, por lo que solicito a usted iniciar con los trámites correspondientes para la ejecución de los trabajos.

Certificación Presupuestaria N° 214.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO.
GP/LB



Recibido
18/07/2022
10:00


Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 214

Transacción No: 218

Fecha: 13/07/2022

Responsable: PATIN PATIN GALO XAVIER

Identificación: Cédula 0201620309

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
SOLICITUD	059-DOP-GADCG-22	07/07/2022	6,231.16	Ing. Galo Patin
MEMORANDO	0203-DP-GADCG-2022	13/05/2022	0.00	Arqs. Sánchez y Jimè
MEMORANDO	0258-MCH-A-GADCG	31/05/2022	0.00	Luis Medardo Chimbol
OFICIO	0722-0564-DOP-GADCG-	30/05/2022	0.00	Ing. Galo Patin
OFICIO	273-TECNICO.O.P.M	25/05/2022	0.00	Ing. Elizabeth INga

DETALLE:


Por pedido del Director de Obras Publicas, en Solicitud de Certif. de Fondos N° 059-DOP-GADCG-22, sumillado por el sr. Director Financiero, y autorizado por el Sr. Alcalde con memorando No.258-MCH-A-GADCG y oficio 273-Tecnico O.P.M; certifico que existe la p.p.para la ejecución de trabajos de ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA , tramo calles Feliza Eguez y Manuel Páliz, área 2.084 m2; según oficio No. 0722-DOP-GADCG-22, suscrito por el Ing. Galo Patin, Director de OO.PP y memorando No. 0203-DP-GADC

MARCELA

Partida Presupuestaria	Valor
00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,231.16
Total =>	6,231.16

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
CANTÓN GUARANDA
OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
9:15 18 JUL 2022
FIRMA


Ing. Marcela Pazmino G.
Analista Presupuesto


Ing. Alex Cordero Rea
Directora Financiera



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Solicitud Certificación de Fondos N° 059-DOP-GADCG-22
Guaranda, 07 de julio 2022

Ingeniero
Alex Cordero
DIRECTOR FINANCIERO
En su Despacho.-

En base a la documentación que adjunto, agradeceré emitir la correspondiente certificación presupuestaria por el monto de **SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO DÓLARES 16/100 CTV (USD 6,231.16) (MAS IVA)** para la ejecución de los trabajos de **ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA, PARROQUIA GUANUJO, CANTÓN GUARANDA**; esto con cargo a la **Partida Presupuestaria 00.00.003.361.750501.000.02.01.000.0.100 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.**

Atentamente,


Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO.
GP/LB



*PRE-SUPUESTO
REVISAR LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA LA SOLICITUD
13 JUL 2022*

HORA: 9:40
13 JUL 2022


FIRMA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio 0722-DOP-GADCG-22
Guaranda, 07 de julio 2022

Ingeniero
Alex Cordero
DIRECTOR FINANCIERO
En su Despacho.-


En atención a su Memorando N° 033-DF-GADCG-2022, adjunto sírvase encontrar las correcciones a las observaciones realizadas. Cabe mencionar que las correcciones realizadas corresponden a errores de forma subsanables más no de fondo.

Trámite en referencia: **SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE FONDOS "ADOQUINADO DEL BARIO MANTILLA"**.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO.
GP/LB



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCION FINANCIERA
MEMORANDO INTERNO
N° 033-DF-GADCG-2022.

DE: Ing. Alex Paul Cordero Rea - DIRECTOR FINANCIERO (e)

PARA: Ing. Galo Patin – DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ASUNTO: En el texto


FECHA: Guaranda 01 de Julio de 2022

Adjunto al presente remito copia del Memorando N° 026, de fecha 1 de Junio del 2022, emitido por Angélica María Núñez Soliz en calidad de Analista de Presupuesto (e), en el cual da a conocer que lo solicitado mediante la Solicitud de Certificación de Fondos N°. -054-DOP-GADCG-22, de fecha 20 de junio del 2022, en la cual solicita la Certificación Presupuestaria para la ejecución de ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA GUANUJO, CANTON GUARANDA con cargo a la partida presupuestaria Obras Publicas de Transporte y vías misma que no corresponde para el fin solicitado, además analizar el informe de la Ing. Elizabeth Inga y su contratación.


Con este antecedente me permito hacer la devolución del proceso antes mencionado, para que sea revisado y de ser el caso se corrija.

Particular que comunico para los fines pertinentes.


Ing. Alex Paul Cordero Rea
DIRECTOR FINANCIERO
GAD DEL CANTÓN GUARANDA
ADJ.


RECEBIDO

16:40 05 JUL 2022


FIRMA

MEMORÁNDUM N°26

De: Angélica María Núñez Soliz, Funcionaria Municipal

Para: Ing. Alex Cordero. Director Financiero

Asunto: DEVOLUCION DE TRAMITE

Fecha: 01 de julio del 2022

764
01 JUL 2022
HORA: 10:00
FOLIO: 10

Por medio del presente, hago la devolución de la siguiente documentación:

- Solicitud de Certificación de fondos N° 054 DOP-GADCG-22, que corresponde al trámite de ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA de la parroquia GUANUJO del Cantón Guaranda, por cuanto la Partida de Obras Publicas de Transporte y Vías no corresponde a los trabajos a realizarse.
- Solicitud de Certificación de fondos N° 207 ADQ-GADCG, que corresponde a la adquisición de combustible (gas licuado) para ser utilizado en la piscina Municipal, por cuanto el saldo es insuficiente al pedido de la partida de Combustibles y Lubricantes.
- Memorando Interno N° 264 MCH-A –GADCG 264 MCH-A-GADCG, en el que solicita el traspaso de partidas presupuestarias, por cuanto el informe debe estar debidamente motivado.

Tramites que fueron sumillados a mi persona, mientras estuve encargada en el cargo de Analista de Presupuesto.

Atentamente



Sra. Angélica Núñez.
Empleada Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Solicitud Certificación de Fondos N° 054-DOP-GADCG-22
Guaranda, 20 de junio 2022

Ingeniero
Alex Cordero
DIRECTOR FINANCIERO
En su Despacho.-

En base a la documentación que adjunto, agradeceré emitir la correspondiente certificación presupuestaria por el monto de **SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO DÓLARES 16/100 CTV (USD 6,231.16) (MAS IVA)** para la ejecución de los trabajos de **ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA, PARROQUIA GUANUJO, CANTÓN GUARANDA**; esto con cargo a la **Partida Presupuestaria 00.00.003.361.750105. OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS.**

Atentamente,


Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO.
GP/LB

✗ No tiene esa Partida.


RESUELTO
WEBB DE REVISAR LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA LO SOLICITADO
22 JUN 2022



HORA:
15:02 0 JUN 2022

FIRMA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

MEMORANDO INTERNO
NO. 258-MCh-A-GADCG


DE Luis Medardo Chimbolema, Alcalde del cantón Guaranda
PARA Ing. Galo Patín, Director de Obras Públicas del GADCG
ASUNTO En el texto
FECHA Guaranda mayo 31, 2022

En respuesta a su Oficio No. 0564-DOP-GADCG-22, en atención a la solicitud de autorización del primer personero municipal para lo que será la ejecución del proyecto **ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA**, siendo necesario esta construcción a fin mejorar el ornato de la ciudad, en la calidad que me asiste como Alcalde del cantón Guaranda y en base a los documentos adjuntos autorizo debidamente dicha construcción; en tal virtud, sírvase proceder en consecuencia y a efecto el cumplimiento del objetivo propuesto.

Atentamente,


Luis Medardo Chimbolema
ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA.

C.C. archivo.



*Remitir a la Área
Financiera para
continuar con el
trámite pertinente*

02/06/2022


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
OBRAS PÚBLICAS
RECEBIDO
HORA: 10:50 01 JUN 2022
FIRMA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio 0564-DOP-GADCG-22
Guaranda, 30 de mayo 2022

Compromiso al Descentralizado
Gobierno Autónomo Descentralizado
GUARANDA
ALCALDÍA
Por Guaranda yo me sumo

FECHA: 30/05/2022

FIRMA: [Firma]

ADMINISTRATIVO ☐	TALENTO HUMANO ☐	ASESOR JURÍDICO ☐
FINANCIERO ☐	GESTIÓN AMBIENTAL ☐	COORDINACIÓN ☐
PLANIFICACIÓN ☐	DESAR. COMUNITARIO ☐	SECRETARÍA ALCALDÍA ☒
OBRAS PÚBLICAS ☐	COMUNICACIÓN ☐	SECRETARÍA CONCEJO ☐

INFORME ☐ AUTORIZADO ☒

Señor
Medardo Chimbolema
ALCALDE DE GUARANDA
En su Despacho.-

Por medio de la presente le hago extensivo un cordial y fraterno saludo, y acudo a usted para poner en vuestro conocimiento el Oficio N° 273-TECNICO.O.P.M, suscrito por la Ing. Elizabeth Inga, Técnico de Obras Públicas, mediante el cual remite informe técnico y presupuesto referencial para el Proyecto de **ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA**.



Por lo anteriormente expuesto, solicito a su Autoridad, la viabilidad respectiva para iniciar con los trámites correspondientes.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

[Firma]

Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO.
GP



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N° 273 – Técnico. O. P. M
Guaranda, 25/05/2022

PARA:

ING. GALO PATÍN

Director de Obras Públicas Municipales

Contratista

Presente.-

De mi consideración:

En atención al **MEMORANDO N° 161 – DOP – GADCG – 22**, donde realizar el presupuesto referencial para el proyecto denominado: **“ADOQUINADO DEL BARRIO MANTILLA”**, ubicado en la parroquia urbana Guanujo, sector del Estadio, barrio Mantilla, tramos de las calles Felisa Eguez y Manuel Paliz, para una área aproximadamente de 2084 m2, estas calles no cuentan con adoquín, el costo de la obra no supera de una Infima Cuantía en un valor de **\$ 6.231,16 SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES, 16/100 CENTAVOS** estos precios **NO INCLUYE IVA**, las cuales serán adoquinadas con adoquines seleccionados del barrio las colinas, el volumen de arena a utilizar son 13 viajes de 8m3 ya que se hizo adquisición de la misma para algunos sectores de la parroquia Guanujo y del casco urbano de Guaranda, la cual se encuentra disponible en bodega, la mano de obra estaba previsto realizar con cuadrilla municipal, pero al momento como es de su conocimiento la cuadrilla se encuentra realizando trabajos de aceras y bordillos en la parroquia Salinas previo al asfaltado, además, con la finalidad de salvaguardar los adoquines que han sido retirados y teniendo en cuenta que en aproximadamente un mes se finaliza los contratos del personal de cuadrilla ya no se contara con el personal necesario para realizar todos los trabajos programados en el cantón, por lo que se sugiere bajo su mejor criterio realizar la contratación de mano de obra únicamente.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	COLOCADA DE ADOQUIN (MANO DE OBRA)	M2	2,084.00	2.99	6,231.16
				TOTAL:	6,231.16

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO O. P. MUNICIPAL
Se Adjunta: APU del rubro detallado

Recibido
26/05/2022
11:20
Reservado a la Alcaldía.
para su revisión y
autorización por el
contratista con el
trámite pertinente

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: READOQUINADO BARRIO MANTILLA

UBICACION: CALLES FELISA EGUEZ Y MANUEL PALIZ, SECTOR DEL ESTADIO, BARRIO MANTILLA, PARROQUIA URBANA GUANUJO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : 1

DETALLE : COLOCADA DE ADOQUIN (MANO DE OBRA)

HOJA 1 DE 1

UNIDAD: M2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.11
CORTADORA	1.00	2.50	2.50	0.170	0.43
SUBTOTAL M					0.54
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	2.00	3.62	7.24	0.200	1.45
ALBAÑIL EO D2	1.00	3.66	3.66	0.200	0.73
SUBTOTAL N					2.18
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O				0.00	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	2.72
INDIRECTOS (%) 10.00%	0.27
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	2.99
VALOR UNITARIO	2.99

SON: DOS DOLARES, 99/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

GUARANDA, 25 DE MAYO DE 2022



Ing. Elizabeth Inga
ELABORADO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MEMORANDO
No. 161-DOP-GADCG-22

DE : Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO.

PARA : Ing. Elizabeth Inga
TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA : Guaranda, 25 de mayo 2022

ASUNTO : **PROYECTO ADOQUINADO PARROQUIA GUANUJO**
VARIOS SECTORES

En atención al Memorando N° 0203-DP-GADCG-2021, suscrito por el Arq. Lenin Sánchez, Director de Planificación, referente al Proyecto de Adoquinado en la parroquia urbana de Guanujo, varios sectores; solicito a usted de la manera más comedida realizar el presupuesto respectivo.

Particular que comunico para los fines consiguientes.


Atentamente,



Ing. Galo Patín

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO

GP/LB



Recibido
25/05/2022




Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.
Memorando N° 0203-DP-GADCG-2022

PARA: Ing. Galo Patín- Director de Obras Públicas del GADCG (E)


ASUNTO: En el texto.

FECHA: Guaranda 13 de Mayo del 2022.

Con un cordial saludo nos dirigimos a usted para exponer lo siguiente:
La Dirección de Planificación del GADCG, dentro de la elaboración de diversos proyectos urbanos, de beneficio colectivo, ha realizado un proyecto de adoquinado en la parroquia urbana de Guanujo, sector del Estadio, barrio Mantilla, tramos de las calles Felisa Eguez y Manuel Paliz en un área comprendida de 2084.00 m2 aproximadamente; calles a adoquinar con la selección de adoquín en buen estado, que fue retirado del barrio las colinas. Ponemos a vuestra consideración este proyecto arquitectónico, para su análisis, elaboración del presupuesto y posterior ejecución de ser posible.

Particular que comunico para los fines consiguientes,

Atentamente,


Arq. Lenin Sánchez O.
Director de Planificación del GADCG
Diany N


Arq. Paul Jiménez
Técnico de Planificación del GADCG

Adjunto: Proyecto arquitectónico.
Volúmenes de Obra



RECIBIDO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
GUARANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

16 MAY 2022

FIRMA

*Ing. Elizabeth Tago.
Favor atender lo
solicitado y
presentar el informe
respectivo
16/05/2022*

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



CUADRO DE VOLÚMENES DE OERA
ÁREA ADOQUINADO: 2084.00 M ²

CALLE MANUEL PALIZ

CALLE: FELIZA EGUEZ

UBICACIÓN



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN GUARANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
ADOQUINADO BARRIO MANTILLA - GUANUO

	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ADOQUINADO BARRIO MANTILLA - GUANUO
PROYECTO:	UBICACIÓN Y PLANTA GENERAL
CONTIENE:	1/1
FECHA:	1/1/2022
ELABORADO POR:	ING. JUAN MANABALA
REVISADO POR:	ING. JUAN MANABALA
APROBADO POR:	ING. JUAN MANABALA
FECHA:	1/1/2022
ELABORADO POR:	ING. JUAN MANABALA
REVISADO POR:	ING. JUAN MANABALA
APROBADO POR:	ING. JUAN MANABALA
FECHA:	1/1/2022
