

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guaranda, 04 de Octubre del 2022
Oficio N.-0149 -DP-GADCG-2022

Ingeniero
Fabián Vásconez
Director de OO.PP.MM del GADCG
En su despacho.-

1496
f
19/10/2022
DIR. FINANCIERA
Solicitar Iniciar
El Trámite Para
El Paso

Adjunto a la presente sírvase encontrar la planilla de la obra: **REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL, PLAZA CORDOVEZ, PARROQUIA GUANUJO** y demás documentos habilitantes, ejecutados por la Sra. Adriana Vásconez Endara, cuyos valores ascienden a la cantidad de \$ 5.112.27 sin incluir el 12% del IVA, por tal motivo solicito de una manera muy comedida, disponer a quien corresponda se proceda a cancelar dichos valores.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente


Ing. Civil David Peñaloza – Fiscalizador del GADCG

Adj.doc



HORA:
10:27 17 OCT 2022

 F I R M A

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA



PROVINCIA : BOLIVAR
UBICACIÓN: GUANUJO
PROYECTO: REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL PLAZA CORDOVEZ
OBRA : REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL PLAZA CORDOVEZ

CONTRATISTA: Sra. Adriana Vasconez Endara
PERIODO: Agosto-Septiembre-2022
FECHA: 04-oct-22
Fiscalizador: Ing. David Penaloza U.
Director OO.PP.MM: Ing. Civil Fabián Vasconez

MONTO : 5,112.27

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		VALORES	
						ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
1	CUBIERTA PVC TIPO TEJA	M2	13.24	21.90	289.96		12.14		265.87
2	CAMBIO DE COLUMPIOS	U	1.00	264.00	264.00		1.00		264.00
3	ESTRUCTURA DE MADERA	M2	7.00	29.30	205.10		9.74		285.38
4	EXCAVACION DE SUELOS	M3	28.15	3.10	87.27		36.02		111.66
5	DESALOJO DE MATERIALES	M3	28.15	8.80	247.72		30.48		268.22
6	RELLENO COMPACTADO	M3	160.00	2.75	440.00		0.00		0.00
7	RELLENO CON RIPIO	M3	14.07	18.81	264.66		27.71		521.23
8	COLOCACIÓN DE CASCARILLA DE PALMA AFRICANA	M3	14.07	13.31	187.27		0.00		0.00
9	CERRAMIENTO DE MADERA H=0.90M	M2	55.33	33.17	1,835.30		60.93		2021.05
10	PINTURA DE ESTRUCTURA DE MADERA	M2	32.32	3.19	103.10		54.84		174.94
11	BORDILLO DE ADOQUIN PARADO	M	38.00	10.05	381.90		38.40		385.92
12	JUEGO INFANTIL (CABALLITO)	U	1.00	550.00	550.00		1.00		550.00
13	JUEGO INFANTIL (SUBE Y BAJA)	U	1.00	264.00	264.00		1.00		264.00
5,120.27						VALOR DE LA PLANILLA			
						IVA 12%			
						613.47			
						5,725.74			

SON: CINCO MIL CIENTO DOCE CON 27 /100 DOLARES

Ing. David Penaloza U.
ELABORADO POR:
Ing. David Penaloza U.

Ing. Fabián Vasconez
REVISADO POR:
Ing. Fabián Vasconez


Sra. Adriana Vasconez Endara
CONTRATISTA
VALOR TOTAL A PAGAR 5,725.74

RESUMEN VOLUMENES DE OBRA

OBRA:REGENERACION PARQUE INFANTIL PLAZA CORDOBEZ

UBICACIÓN:GUANUJO

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	P.U	P.T
PARQUE INFANTIL					
1	CUBIERTA PVC TIPO TEJA	M2	12.14		
2	CAMBIO DE COLUMPIOS	U	1.00		
3	ESTRUCTURA DE MADERA	M2	9.74		
4	EXCAVACIÓN DE SUELO	M3	36.02		
5	DESALOJO DE MATERIALES	M3	30.48		
6	RELLENO COMPACTADO	M3	0.00		
7	RELLENO CON RIPIO	M3	27.71		
8	COLOCACIÓN DE CÁSCARILLA DE PALMA AFRICANA	M3	0.00		
9	CERRAMIENTO DE MADERA H=0.90m	M2	60.93		
10	PINTURA DE ESTRUCTURA DE MADERA	M2	54.84		
11	BORDILLO ADOQUIN PARADO	M	38.40		
12	JUEGO INFANTIL (CABALLITO)	U	1.00		
13	JUEGO INFANTIL (SUBE Y BAJA)	U	1.00		



RUBRO: CUBIERTA PVC TIPO TEJA

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
1.90	1.62	3.08	CASETA 1
1.90	1.62	3.08	CASETA 1
1.30	2.30	2.99	CASETA 2
1.30	2.30	2.99	CASETA 2
TOTAL		12.14	

ANEXO DE VOLUMENES DE OBRA**RUBRO: CAMBIO DE COLUMPIOS**

N.-	UBICACIÓN
1.0	PARQUE
TOTAL	1.0

RUBRO: ESTRUCTURA DE MADERA

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
2.20	1.05	2.31	CUBIERTAS
2.20	1.05	2.31	CUBIERTAS
1.60	1.60	2.56	PASAMANO
1.60	1.60	2.56	PASAMANO
TOTAL		9.74	

RUBRO: EXCAVACIÓN DE SUELOS

L(m)	A(m)	E(m)	VOLUMEN(M3)	UBICACIÓN
20.30	13.65	0.13	36.02	PATIO CENTRAL
TOTAL			36.02	

RUBRO: DESALOJO DE MATERIALES

L(m)	A(m)	E(m)	VOLUMEN(M3)	UBICACIÓN
20.30	13.65	0.11	30.48	PATIO CENTRAL
TOTAL			30.48	

RUBRO: RELLENO CON RIPIO

L(m)	A(m)	E(m)	VOLUMEN(M3)	UBICACIÓN
L(m)	A(m)	E(m)	VOLUMEN(M3)	UBICACIÓN
20.30	13.65	0.10	27.71	PATIO CENTRAL
TOTAL			27.71	

RUBRO: CERRAMIENTO DE MADERA H=0.90m

L(m)	UBICACIÓN
60.93	PARQUE
TOTAL	60.93

RUBRO: PINTURA ESTRUCTURA DE MADERA

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
60.93	0.90	54.84	CERRAMIENTO

RUBRO: BORDILLO ADOQUIN PARADO

L(m)	UBICACIÓN
38.40	PARQUE

RUBRO: JUEGO INFANTIL CABALLITO

N.-	UBICACIÓN
1.00	PARQUE

RUBRO: JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA

N.-	UBICACIÓN
1.00	PARQUE

7.1

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guaranda, 04 de Octubre del 2022

Oficio N.-0167-DP-GADCG-2022

Ingeniero

Fabián Vásquez Ch.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL GADC-G

En su despacho.-

De mi consideración:

En referencia a la orden de trabajo N.-13-D-DOP-GADCG, de fecha 15 de Agosto del 2022, suscrita entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda y la Sra. Adriana Vásquez Endara, para la ejecución de la obra "REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL, PLAZA CORDOVEZ, PARROQUIA GUANUJO"; debo indicar lo siguiente:

INFORME DE LA FISCALIZACION DE INFIMA CUANTIA

INFORME No.	1
Fecha de presentación	04-Octubre -2022
Periodo de trabajo	15-AGOSTO-22 HASTA 28-SEPTIEMBRE DEL 2022
Fiscalizador	Ing. Civil David Peñaloza Ulloa
Proyecto	REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL, PLAZA CORDOVEZ, PARROQUIA GUANUJO
Entidad contratante	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.
Contratista	Sra. Adriana Vásquez Endara
Orden de trabajo	13-D-DOP-GADCG
Fecha de Orden de Trabajo	15-AGOSTO-2022
Fecha de inicio de los trabajos	15-AGOSTO-2022
Monto del Proyecto	\$ 5120.27
Monto trabajado en este periodo	\$ 5112.27
% de avance este periodo	100 %
Plazo contractual	45 días
Multas	Ninguna
Estado general de tiempo	SOLEADO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.-

- Excavación de suelo
- Cubierta PVC, tipo teja
- Cambio de columpios
- Estructura de madera
- Desalojo de materiales
- Relleno con ripio
- Cerramiento de madera H=0.90m
- Pintura estructura de madera
- Bordillo de adoquín parado
- Juego infantil(caballito)
- Juego infantil(sube y baja)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE CALIDAD.-

Esta Fiscalización ha realizado el control de calidad y así exigiendo al contratista que cumpla con todas las especificaciones y parámetros de calidad en cada uno de los rubros ejecutados en el proyecto.

PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA.-

En el libro de obra se registra la utilización de maquinaria y el personal que labora diariamente en el proyecto.

LABOR REALIZADA POR LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.-

Seguimiento del proceso constructivo de la obra, de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del Proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

En los actuales momentos esta obra se encuentra en pleno funcionamiento, por tal motivo se debe coordinar con la cuadrilla de trabajos de parques y áreas verdes, para que a lo futuro realicen el respectivo mantenimiento y no dejar destruir la infraestructura del mismo.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.



Ing. Civil David Peñaloza Ulloa-Fiscalizador del GADCG

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS INFIMA CUANTIA

Acta de Entrega y Recepción Única de la obra: **"REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL, PLAZA CORDOVEZ, PARROQUIA GUANUJO"** ejecutado por la Sra. Adriana Vásquez Endara, previa orden de trabajo N.-013-DOP-GADCG, de fecha 15 de Agosto del 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los 04 días del mes de Octubre del dos mil veinte y dos, comparecen por una parte el **Ing. Civil Fabián Vásquez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón Guaranda, el **Ing. Civil David Peñaloza Ulloa en calidad de Observador – Fiscalizador de la obra**, y por otra parte la Sra. Adriana Vásquez Endara, en calidad de contratista del proyecto, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra la obra y proceder a realizar la recepción única de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de Alcalde del Cantón y por otra parte la Sra. Adriana Vásquez Endara en calidad de contratista, proceden a construir el Proyecto: **"REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL, PLAZA CORDOVEZ, PARROQUIA GUANUJO"** con la partida presupuestaria N° 00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 correspondiente a Obras de Infraestructura, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: Sra. Adriana Vásquez Endara

Orden de trabajo: **REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL, PLAZA CORDOVEZ, PARROQUIA GUANUJO**

Valor presupuesto original: USD 5.120.27

Fecha de inicio de trabajos: 15 de Agosto del 2022

Plazo: 45 días calendario, desde la orden de trabajo

Valor del anticipo: USD ninguno

Monto trabajado: USD 5.112.27 + 12% del IVA

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACION.-

La Fiscalización informa que la obra objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción única, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación:

RUBRO Y CANTIDADES CONTRATADAS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U
1	CUBIERTA PVC TIPO TEJA	13.24	M2
2	CAMBIO DE COLUMPIOS	1.00	U
3	ESTRUCTURA DE MADERA	7.00	M2
4	EXCAVACIÓN DE SUELOS	28.15	M3
5	DESALOJO DE MATERIALES	28.15	M3
6	RELLENO COMPACTADO	160.00	M3
7	RELLENO CON RIPIO	14.07	M3
8	COLOCACIÓN DE CASCARILLA AFRICANA	14.07	M3
9	CERRAMIENTO DE MADERA H=0.90M	55.33	M2
10	PINTURA ESTRUCTURA DE MADERA	32.32	M2
11	BORDILLO ADOQUIN PARADO	38.00	M
12	JUEGO INFANTIL(CABALLITO)	1.00	U
13	JUEGO INFANTIL(SUBE Y BAJA)	1.00	U

RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADOS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U
1	CUBIERTA PVC TIPO TEJA	12.14	M2
2	CAMBIO DE COLUMPIOS	1.00	U
3	ESTRUCTURA DE MADERA	9.74	M2
4	EXCAVACIÓN DE SUELOS	36.02	M3
5	DESALOJO DE MATERIALES	30.48	M3
6	RELLENO COMPACTADO	0.00	M3
7	RELLENO CON RIPIO	27.71	M3
8	COLOCACIÓN DE CASCARILLA AFRICANA	0.00	M3
9	CERRAMIENTO DE MADERA H=0.90M	60.93	M2
10	PINTURA ESTRUCTURA DE MADERA	54.84	M2
11	BORDILLO ADOQUIN PARADO	38.40	M
12	JUEGO INFANTIL(CABALLITO)	1.00	U
13	JUEGO INFANTIL(SUBE Y BAJA)	1.00	U

TERCERA: LIQUIDACION ECONOMICA.

El Valor trabajado es de \$ 5.112.27

Liquidación que no incluye IVA

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS.

Plazo contratado: 45 días

Fecha de inicio trabajos: 15 de Agosto del 2022

Fecha de entrega de la obra 28 de Septiembre del 2022

Ampliaciones autorizadas de plazo 0 días

Tiempo empleado 45 días

Días de mora 0 días

QUINTA: RECEPCION DE LA OBRA DE INFIMA CUANTIA


Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción, una vez que se ha verificado que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADCG ya que ha sido ejecutada de acuerdo a los planos, especificaciones generales y técnicas y a las cláusulas contractuales.

De conformidad con lo contratado y establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos de **“REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL, PLAZA CORDOVEZ, PARROQUIA GUANUJO”**, quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes componentes de la estructura se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes a la etapa a su cargo.


SEXTA: DEVOLUCION DE GARANTIAS.

Ninguna devolución de garantía.


Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, el 04 de Octubre del dos mil veinte y dos.


Ing. Civil Fabián Vásconez

DIRECTOR DE OO. PP. MM.


Ing. Civil David Peñaloza

FISCALIZADOR


Sra. Adriana Vásconez

CONTRATISTA





Cerramientos Madera.



Colocada cerramiento Madera.



Techo en Juegos



Colocado Coma de Arena.



3 Columpios. Juegos Infantiles.



Cerramiento madera y Pintura
en Madera.

4/1



Corramiento Holera-



Corramiento Holera-



Nivelado Terreno con Arena-



Bordillo de Adoquin-



Nivelado de Terreno
con Material Ripio-



Bordillo con Adoquin
Excavación de Terreno y Nivelación + /




Nivelación de piso con Arena y Ripio.



Juego Infantil Sube y Baja.



Juegos Infantiles.

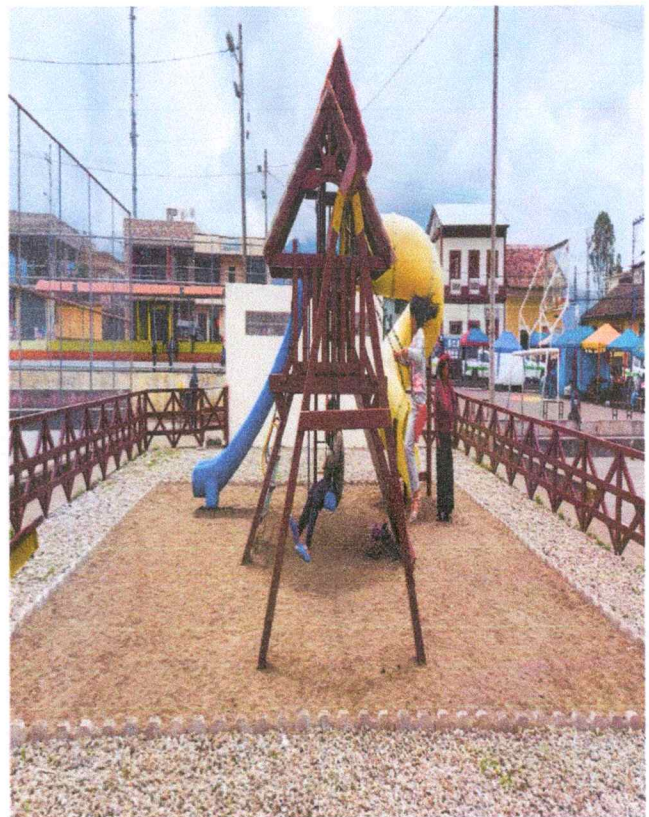


3 Columnas y Cama de Arena.


f.1.




Juego Infantil Seib y Baja-

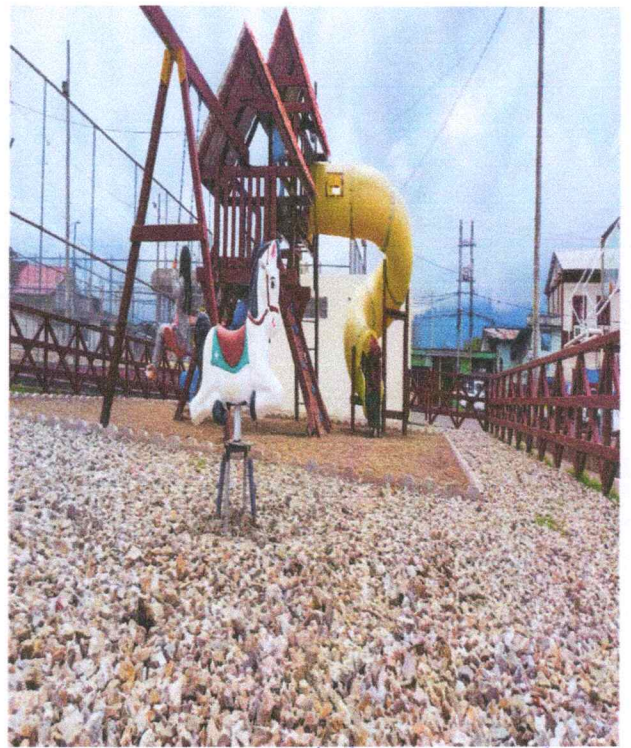

Juego Infantiles Caballito-

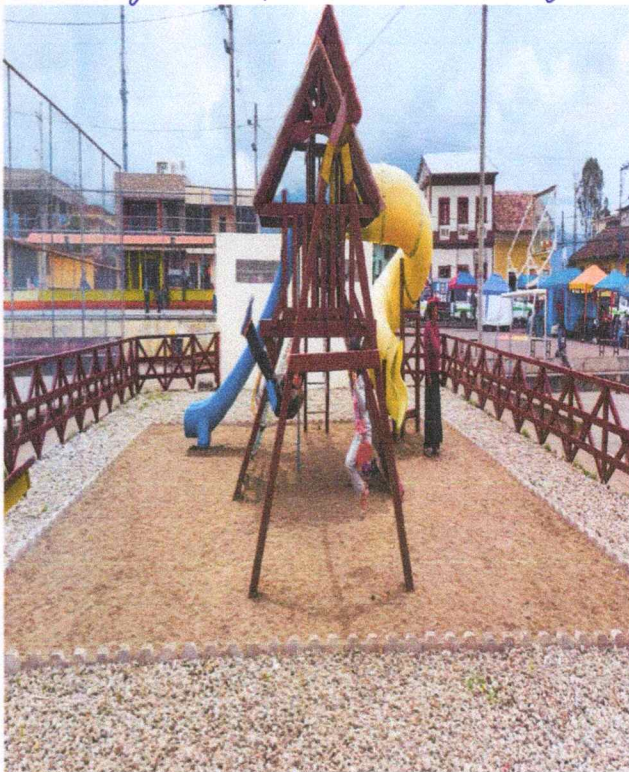


Juego Infantil Columpio-

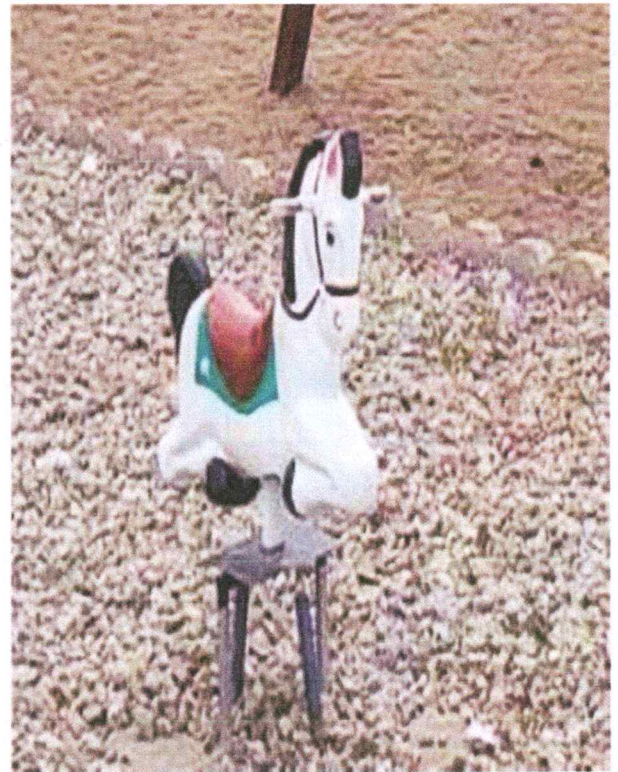

Juego Infantil Caballito-

7.1

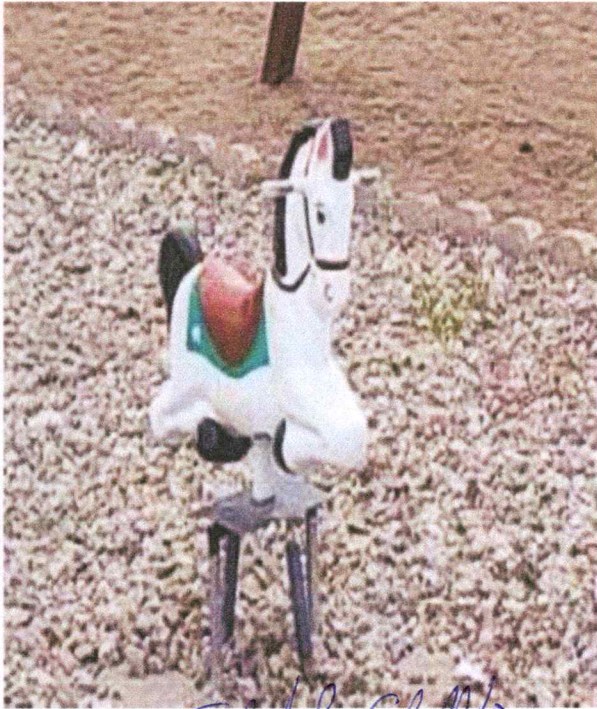


Juego Infantil Caballito.



Columpios. - Juegos Infantiles.



Juegos Infantiles.
 - Sube y Baja.
 - Columpios.
 - Caballito.
 - Cubierta en Juegos Infantiles

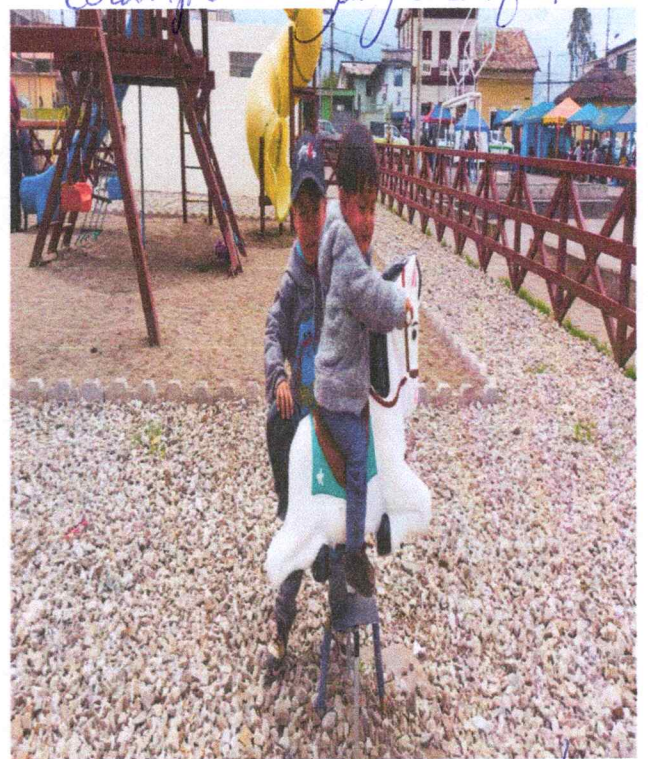

Juego Infantil Caballito.

7/1
