



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N° 232 – Técnico. O. P. M
Guaranda, 13/04/2022

Ingeniero.

WILIAN MANOBANDA

Director de Obras Públicas Municipales

Presente.-

De mi consideración:

En atención al **OFICIO N° 0253-DOP-GADCG-22**, en el cual me nombran como fiscalizado por medio de esto le informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución: “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO”, el cual se encuentra ubicado en el barrio San Miguelito, parroquia Guanujo.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: Sr. Alfonso Manobanda Zaruma

Orden de Trabajo N°: 02-DOP-GADCG

Fecha de suscripción: 10 de Marzo del 2022

Monto del Presupuesto: \$ 7590.44 USD incluye IVA

Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo

Porcentaje del anticipo %: 0

Plazo: 20 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 30 de marzo del 2022

Días Trabajados: 20 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Sr. Alfonso Manobanda Zaruma, cuya liquidación es de **\$6777.18** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO O. P. MUNICIPAL

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCANTARA

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA										
PLANILLA:		LIQUIDACION		PERIODO: 2022-ABRIL		MONTO DE PLANILLA:		6777.18		6777.18		
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERÍOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO				MONTO DE ANTICIPO:		0		0		
UBICACIÓN:		BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO		PROCESO:		MANO DE OBRA		FECHA DE INICIO:		10-mar-22		
MONTO DE:		6777.18						FECHA CONTRATO:		TRABAJOS POR DESTA/O		
CONTRATISTA:		MANOBANDA ZARUÑA ALFONSO						AMPLIACIÓN DE PLAZO:		CONTRA ENTREGA:		
RUBRO N°	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			IMPORTE			PRESUPUESTO	% A LA FECHA	OBSERVACIONES
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA ANTERIOR	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO			
1	ENCOFRADO-DESEN. PARA CANCHA	M2	6.02	88.28	88.28	531.45	531.45	531.45	531.45	531.45		
2	ENCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0.2m	M3	9.73	7.45	7.45	72.53	72.53	72.53	72.53	72.53		
3	HORMIGON CICLOPEO. f'c 180 kg/cm2	M3	51.12	53.17	53.17	2717.92	2717.92	2717.92	2717.92	2717.92		
4	HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2	M3	82.75	32.70	32.70	2813.42	2813.42	2813.42	2813.42	2813.42		
5	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3	M2	4.75	135.13	135.13	641.87	641.87	641.87	641.87	641.87		
				TOTALES			TOTALES					
				ANTICIPO: 0%			ANTICIPO: 0%					
				MULTAS: 0%			MULTAS: 0%					
				RET. FUENTE: 0%			RET. FUENTE: 0%					
				VALOR ESTIA PLANILLA IVA 12%			VALOR ESTIA PLANILLA IVA 12%					
				LÍQUIDO			LÍQUIDO					

MAO 3

DIRECTOR DE OOPPMM

ING. WILLIAM MANOBANDA

FISCALIZADOR

ING. ELIZABETH INGA

SR. ALFONSO MANOBANDA

CONTRATISTA



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA								 Guaranda ALCALDÍA
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO PARROQUIA GUANUJO							
UBICACIÓN:	BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO							
RUBROS:	MEDIDAS (M)			Area (M2)	VOLUMENES		Total	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal		
ENCOFRADO-DESEN. PARA CANCHA	53.20					53.20	88.28	
	35.08					35.08		
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0.2m	17.54	0.50	0.85		7.45	7.45	7.45	
HORMIGON CICLOPEO, Fc 180 kg cm ²	17.54	0.50	0.85		7.45	7.45	53.17	
	17.54	0.46	0.50		4.03	4.03		
	18.60	0.49	0.48		4.37	4.37		
	19.18	0.49	0.43		4.04	4.04		
	26.60	0.48	0.52		6.64	6.64		
	27.05	0.50	0.99		13.39	13.39		
	27.57	0.50	0.96		13.23	13.23		
HORMIGON S. Fc=210 kg cm ²	26.60	17.50	0.07		31.59	31.59	34.00	
	53.20	0.10	0.20		1.06	1.06		
	17.50	0.10	0.20		0.35	0.35		
ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3	17.54	1.00	-	17.54	-	17.54	135.13	
	18.09	1.01	-	18.27	-	18.27		
	18.58	0.96	-	17.84	-	17.84		
	26.60	1.02	-	27.13	-	27.13		
	27.05	0.99	-	26.78	-	26.78		
	27.57	0.97	-	26.74	-	26.74		
	0.60	0.53	-	0.32	-	0.32		
	0.51	0.53	-	0.27	-	0.27		
	0.50	0.48	-	0.24	-	0.24		
 FISCALIZADOR				 CONTRATISTA				
ING. ELIZABETH INGA				SR. ALFONSO MANOBANDA				


FISCALIZADOR

ING. ELIZABETH INGA


CONTRATISTA

SR. ALFONSO MANOBANDA


Por Guaranda yo me muevo




Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
 Teléfono: (032) - 551088 - 551089
 E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Respaldo Fotográfico:

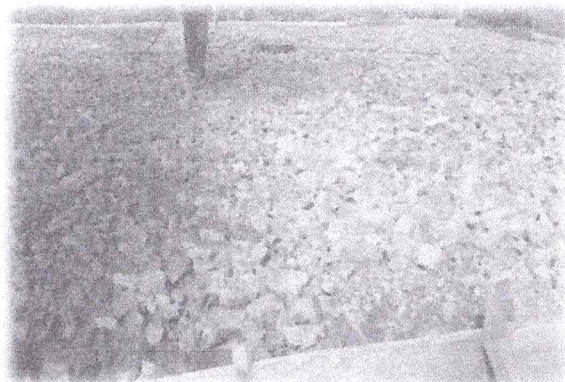

Encofrado perimetral de la cancha

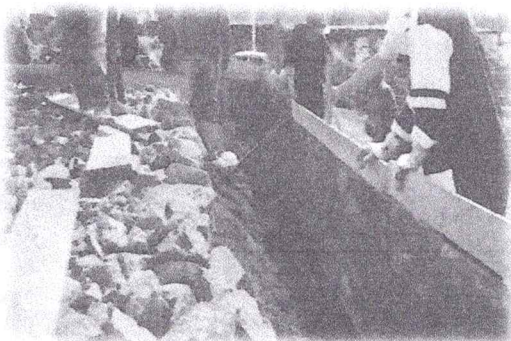


Fundición del muro hormigón ciclopeo y cancha hormigón simple

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Respaldo Fotográfico:



Encofrado perimetral de la cancha

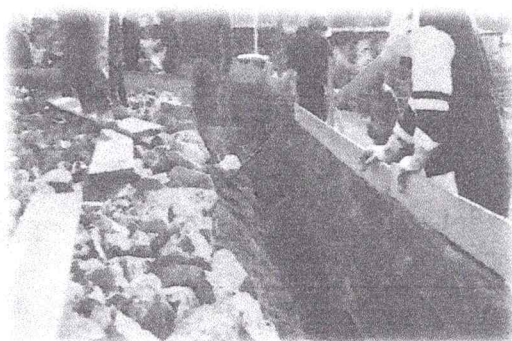

Fundición del muro hormigón ciclopeo y cancha hormigón simple

Guaranda, 30 de marzo del 2022

PARA:
ING. ELIZABETH INGA S
Fiscalizador Municipal

Presente:

De mi consideración:

Con forme a la orden de trabajo suscrito por el Director de Obras Públicas Municipales Ing. Wiliam Manobanda, donde usted es nombrado como fiscalizador, le comunico que la obra **“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO”** se encuentra terminado, por lo que solicito por vuestro intermedio se haga la planilla única de liquidación y prosiga con el trámite correspondiente para el cobro de la misma.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente:



Sr. Alfonso Manobanda Zaruma
CONTRATISTA



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÍNFIMA CUANTÍA

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO”, entregado por el Sr. ALFONSO MANOBANDA ZARUMA, previo orden de trabajo N° 02-DOP-GADCG, de fecha 10 de marzo de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ING. WILIAM MANOBANDA.

En la ciudad de Guaranda a los 13 días del mes de abril del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. WILIAM MANOBANDA, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. Alfonso Manobanda Zaruma para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO”; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	ENCOFRADO-DESEN. PARA CANCHA	ML	6.02	88.28	531.45
2	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m	M3	9.73	7.45	72.53
3	HORMIGON CICLOPEO, f _c 180 kg/cm ²	M3	51.12	53.17	2717.92
4	HORMIGON S. f _c =210 kg/cm ²	M3	82.75	34.00	2813.42
5	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3	M2	4.75	135.13	641.87
TOTAL PARCIAL					6777.18
IVA 12%					813.26
TOTAL					7590.44

CLASUSULA I:

Se realizó la fiscalización del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO”, en donde se recalca que durante la ejecución de la obra se entregó un total de 457 sacos de cemento, para la ejecución de esta obra ya que en el presupuesto referencial no se tomó en cuenta sacos de cemento para los rubros siguientes:

- HORMIGON CICLOPEO, f_c 180 kg/cm²
- HORMIGON S. f_c=210 kg/cm²
- ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3

Por Guaranda y sus rios



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 10 de Marzo del 2022

Plazo: 20 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 30 de marzo del 2022

Días Trabajados: 20 días, no existe mora


RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:


Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO".

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA Y GRADERIOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, PARROQUIA GUANUJO", hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,


Ing. Wiliam Manobanda
DIRECTOR DE OO.PP.MM


Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO OO.PP.MM


Sr. Alfonso Manobanda Zaruma
CONTRATISTA

