



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N° 234 – Técnico. O. P. M
Guaranda, 18/04/2022

Ingeniero.

WILIAN MANOBANDA

Director de Obras Públicas Municipales

Presente.-

De mi consideración:

En atención al **OFICIO N° 0301-DOP-GADCG-22**, en el cual me nombran como fiscalizado por medio de esto le informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución: **“CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMANO EN EL PASAJE COMUNAL DE LA CDLA. JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA”**, el cual se encuentra ubicado en la calle García Moreno y Abdon Calderón.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: Sr. Segundo Pachala Agualongo

Orden de Trabajo N°: 03-DOP-GADCG

Fecha de suscripción: 30 de Marzo del 2022

Monto del Presupuesto: \$ 2176.11 USD incluye IVA

Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo

Porcentaje del anticipo %: 0

Plazo: 15 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 14 de abril del 2022

Días Trabajados: 15 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Sr. Segundo Pachala Agualongo, cuya liquidación es de **\$1942.96** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO O. P. MUNICIPAL





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA											
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		LIQUIDACION		PERIODO: 2022-ABRIL		MONTOS DE PLANILLA:		1942.96			
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UN PASADIZO EN EL PASADIZO COMUNAL DE LA CDLA. JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA				MONTOS DE ANTICIPO:		0			
UBICACION:		CALLE GARCIA MORENO Y ARDON CALDERON				FECHA DE INICIO:		30-mar-22			
MONTOS DE:		1942.96				FECHA CONTRATO:		TRABAJOS POR DESTAJO			
CONTRATISTA:		PACHALA AGUALONGO SEGUNDO				AMPLIACION:		CONTRA ENTREGA:			
						DE PLAZO:		% A LA FECHA			
								OBSERVACIONES			
RUBRO N°	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL CONTRATADO	CANTIDADES	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	ESTIMADO PERIODO	TOTAL A LA FECHA	PREPUESTO
1	DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAIPOSTERIA	M2	2.22	14.35			10.54	10.54	23.40	23.40	31.86
2	PICADO DE PAREDES	M2	0.99	11.91			12.09	12.09	11.97	11.97	11.79
3	DESALOTO MECANICO VOLQUETA	M3	3.45	4.00			1.67	1.67	5.76	5.76	13.80
4	TIERRA ESCOMBROS D=8cm	KG	1.85	130.00			102.29	102.29	189.23	189.23	240.50
5	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	M3	309.66	1.50			0.84	0.84	176.80	176.80	314.49
6	HORMIGON S Fc=210 kg/cm2 EN VIGAS	M3	11.59	80.00			35.51	35.51	404.48	404.48	911.20
7	ENCUFRADO	M2	4.74	155.00			155.00	155.00	734.70	734.70	734.70
8	MORTERO 1:3	U	3.43	130.00			115.63	115.63	396.63	396.63	445.90
9	BALUSTES HORMIGON	N2									
10	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR	N2									
				TOTALS		1942.96		1942.96		2704.24	
				ANTICIPO:		0%		0			
				MULTAS:		0%		0			
				VALOR ESTE PLANILLA		1942.96		1942.96			
				IVA		23.16		23.16			
				LIQUIDO		2176.11		2176.11			
DIRECTOR DE OBRAS		FISCALIZADOR		CONTRATISTA		CONTRATISTA		CONTRATISTA			
ING. WILLIAM MANOABANDA		ING. ELIZABETH INGA		SR. SEGUNDO PACHALA		SR. SEGUNDO PACHALA		SR. SEGUNDO PACHALA			

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA											
OBRA:		CONSTRUCCION DE UN PASAMANO EN EL PASAJE COMUNAL DE LA CDLA JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA									
UBICACIÓN:		CIUDAD DE LA JUAN XXIII EN LA CALLE GARCIA MORENO Y ABDON CALDERON									
RUBROS:		MEDIDAS (M)			Area (M2)	VOLUMENES		Total	Observaciones		
		Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal				
DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MANIPONERIA		13.70	0.18		2.48		2.48	10.54			
		3.43	0.18		0.62		0.62				
		24.83	0.18		4.46		4.46				
		27.10	0.18		4.88		4.88				
		0.79		0.97	0.78		0.78				
PICADO DE PAREDES		0.85		0.75	0.63		0.63	12.68			
		0.83		0.64	0.53		0.53				
		0.80		0.89	0.71		0.71				
		0.80		1.13	0.90		0.90				
		0.80		0.92	0.73		0.73				
		0.80		0.84	0.67		0.67				
		0.79		0.72	0.56		0.56				
		0.72		0.95	0.78		0.78				
		0.81		0.96	0.80		0.80				
		0.83		0.96	0.79		0.79				
		0.81		0.92	0.74		0.74				
		0.84		0.92	0.73		0.73				
		0.82		0.95	0.77		0.77				
		0.85		1.00	0.80		0.80				
		1.04		1.00	1.04		1.04				
		DESALZO MECANICO VOLQUETA TIERRA ESCOMBROS D=35m		0.43	0.11	0.11	0.53				
55.26	0.18			0.07		0.69	0.69				
13.26	0.01			0.91		0.12	0.12				
		a (m)	banchales/terraplazo	n varillas	n	Parcial	Subtotal	Total	Peso (kg/m)	Peso (kg)	Peso Total (kg)
ACERO DE REFUERZO Fe= 4200 kg/cm2 (8MM)		0.15	0.10	1	202.00	0.23	61.20	61.50	0.40	26.20	102.29
ACERO DE REFUERZO Fe= 4200 kg/cm2 (10MM)		13.20	0.70	C	2.00	13.90	27.80	122.72	0.67	76.09	
		3.43	0.10	C	2.00	2.33	7.06				
		14.83	0.70	C	2.00	11.13	21.06				
HORMIGON S. Fe=210 kg/cm2 EN VIGAS INC ENCOFRADO		27.10	1.30	C	2.00	28.40	56.80	0.84			
		13.20	0.18	0.08		0.19	0.19				
		3.43	0.18	0.08		0.05	0.05				
		14.83	0.18	0.08		0.21	0.21				
FINI LUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:1		27.10	0.18	0.08		0.39	0.39	35.51			
		13.20	0.40		5.28		5.28				
		0.79	0.97		0.77		0.77				
		0.85	0.75		0.63		0.63				
		0.85	0.64		0.53		0.53				
		3.43	0.40		3.97		3.97				
		0.80	0.89		0.71		0.71				
		14.83	0.40		5.93		5.93				
		0.80	1.13		0.90		0.90				
		0.80	0.92		0.73		0.73				
		0.80	0.84		0.67		0.67				
		0.79	0.72		0.56		0.56				
		27.10	0.40		10.84		10.84				
		0.77	0.95		0.73		0.73				
		0.84	0.96		0.81		0.81				
		0.83	0.96		0.80		0.80				
		0.81	0.92		0.74		0.74				
		0.84	0.92		0.77		0.77				
		0.82	0.95		0.78		0.78				
		0.85	1.00		0.80		0.80				
		1.04	1.00		1.10		1.10				
BALUSTRES HORMIGON		155.00					155.00	155.00			

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RESPALDO FOTOGRÁFICO





PASAMANOS DE LA JUAN XXIII ANTES DE INICIAR LA OBRA



DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA, PICADO, DESALOJO DE ESCOMBROS

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

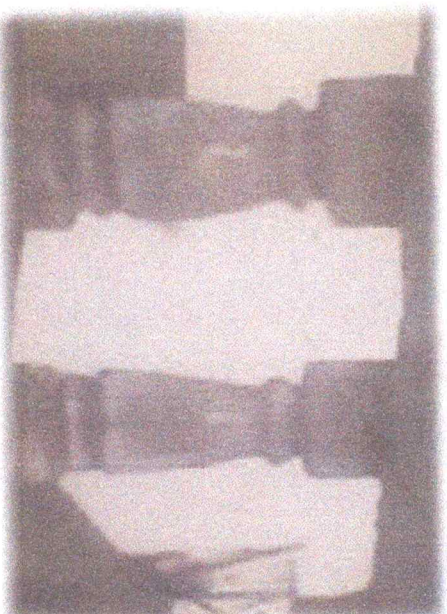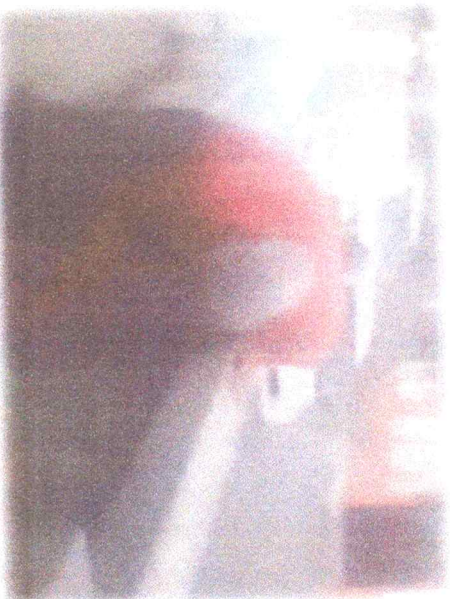

ENTUCIDO Y COLOCACIÓN DE MORISCOS



PASAMANOS CON VIGAS DE HORMIGON ARMADO, PINTURA TERMINADO



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÍNFIMA CUANTÍA

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, "CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMANO EN EL PASAJE COMUNAL DE LA CDLA. JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA", entregado por el Sr. SEGUNDO PACHALA AGUALONGO, previo orden de trabajo N° 03-DOP-GADCG, de fecha 30 de marzo de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM ING. WILIAM MANOBANDA.

En la ciudad de Guaranda a los 18 días del mes de abril del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. WILIAM MANOBANDA, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. Segundo Pachala Agualongo para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMANO EN EL PASAJE COMUNAL DE LA CDLA. JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA"; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA	M2	2.22	10.54	23.40
2	PICADO DE PAREDES	M2	0.99	12.09	11.97
3	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOBROS D=5km	M3	3.45	1.67	5.76
4	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	KG	1.85	102.29	189.23
5	HORMIGON S. fc=210 kg/cm2 EN VIGAS INC. ENCOFRADO	M3	209.66	0.84	176.80
6	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3	M2	11.39	35.51	404.48
7	BALUSTRES HORMIGON	U	4.74	155.00	734.70
8	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR	M2	3.43	115.63	396.63
TOTAL PARCIAL					1942.96
IVA 12%					233.16
TOTAL					2176.11

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 30 de marzo del 2022

Plazo: 15 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 14 de abril del 2022

Días Trabajados: 15 días, no existe mora

Por Guaranda y no meno



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) - 551088 - 551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS


RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, "CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMANO EN EL PASAJE COMUNAL DE LA CDLA JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA".


Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, "CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMANO EN EL PASAJE COMUNAL DE LA CDLA. JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA", hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,


Ing. William Manobanda
DIRECTOR DE OO.PP.MM


Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO OO.PP.MM


Sr. Segundo Pachala Agualongo
CONTRATISTA

