



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guaranda, 29 de Noviembre del 2022
Oficio N.-0298 -DP-GADCG-2022

Ingeniero
Fabián Vásquez
Director de OO.PP.MM del GADCG
En su despacho.-

f
29/11/2022
Dip. FINANCIERA
Solicito el TRAMITE
PARA el PAGO

Adjunto a la presente sírvase encontrar la planilla de la obra: "ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA" y demás documentos habilitantes, ejecutados por el Sr. Segundo Chimbo Ninabanda, cuyos valores ascienden a la cantidad de \$ 6.446.19 sin incluir el 12% del IVA, por tal motivo solicito de una manera muy comedida, disponer a quien corresponda se proceda a cancelar dichos valores.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente

Ing. Civil David Peñaloza
Ing. Civil David Peñaloza – Fiscalizador del GADCG

Adj.doc

GUARANDA
RECIBIDO
ORA:
12:03 29 NOV 2022
FIRMA



Published by the
 American Chemical Society
 11 Dupont Circle, N.W.
 Washington, D.C. 20036
 Phone 202/852-0123
 Fax 202/852-0150
 E-mail: pubs@acshq.org

CONTRATISTA: Sr. Segundo Chimbo
PERIODO: nov-22
FECHA: 28-nov-22
Fiscalizador: Ing. David Peñaloza
Director OO.PP.MM Ing. Civil Fabian V

PERIODO: nov-22

FECHA: 28-nov-22

Fiscalizador: Ine. David Peñaloza II

Director OO.PP.MM Ing. Civil Fabián Vásconez

		6446.19	6446.19
	IVA 12%	773.54	

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 19/100 DOLARES

REVISADO POR:
Ing. Fabián Vásconez

VALOR TOTAL A PAGAR

7.219.73

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

OBRA: ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		
1	ARREGLO DE CUBIERTA-BAJANTES-CANALES	M2	63.84		
2	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE CIELO RAZO	M2	0.00		
3	ACCESORIOS DE ARREGLO DE INODOROS	U	0.00		
4	ACCESORIOS DE ARREGLO DE LAVAMANOS	U	0.00		
5	CIELO FALSO DE PVC-TIPO MADERA	M2	158.28		
6	ENLUCIDO PASTEADO COGIDA DE FALLAS	M2	10.00		
7	LUMINARIA FLUORESCENTE DOBLE 40W	PTO	8.00		
8	PINTURA ANTICORROSIVA	M2	17.77		
9	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS LIMPIEZA)SATINADA	M2	213.85		
10	ARREGLO DE PUERTAS	U	0.00		
11	PUERTA METALICA TUBO RECTANGULAR Y VARILLA CUADRADA	M2	5.89		
12	VIDRIOS CLARO 4MM	M2	4.77		
13	CANALON DE AGUAS LLUVIAS PVC	M	53.20		
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS	U	2.00		
15	PUERTAS PARA BAÑOS 1.80X0.60 MADERA+MDF	U	2.00		
16	CERAMICA PARA PISO	M2	6.68		
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANO	U	1.00		
18	ILUMINACION	PTO	4.00		

F/

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

RUBRO: CANALON DE AGUAS LLUVIAS PVC

L(m)	UBICACIÓN
53.20	TECHO DE LA CASA ARTESANAL

RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACION INODOROS+ACCESORIOS

NUMERO	UBICACIÓN
2.00	BAÑOS CASA ARTESANAL

RUBRO: CIELO FALSO DE PVC-TIPO MADERA-SALON

L(m)	A(m)	AREA(m2)	L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
19.25	6.60	127.05	4.40	2.15	9.46	COCINA
TOTAL		127.05	2.40	3.00	7.20	BAÑO
RUBRO: ENLUCIDO PASTEADO COGIDA DE FALLAS			6.20	2.35	14.57	SALON
L(m)	A(m)	AREA(m2)			31.23	
10.00	1.00	10.00				
TOTAL		10.00				

RUBRO: LUMINARIAS FLUORESCENTES DOBLE 40W

NUMERO	UBICACIÓN
8.00	SALA CASA ARTESANAL

RUBRO: PINTURA ANTICORROSIVA

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
1.60	1.60	2.56	VENTANAS
1.60	1.20	1.92	VENTANAS
1.60	1.60	2.56	VENTANAS
1.60	1.60	2.56	VENTANAS
1.65	1.20	1.98	VENTANAS
1.00	2.00	2.00	VENTANAS
1.20	1.65	1.98	VENTANAS
0.90	2.45	2.21	PUERTA
TOTAL		17.77	

RUBRO: PINTURA CAUCHO DOS MANOS SATINADA

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
13.95	2.90	40.46	SALA
1.75	1.85	3.24	SALA
1.20	3.00	3.60	SALA
1.70	3.30	5.61	SALA
1.70	3.30	5.61	SALA
15.45	3.50	54.08	SALA
13.00	3.30	42.90	SALA
5.40	3.15	17.01	SALA
4.60	4.60	21.16	FACHADA
0.35	5.40	1.89	FACHADA
1.70	0.40	0.68	FACHADA
1.70	0.40	0.68	FACHADA
1.70	0.40	0.68	FACHADA
1.70	0.40	0.68	FACHADA
3.10	4.30	13.33	FACHADA
1.55	2.40	3.72	FACHADA
1.55	2.40	3.72	FACHADA

41.

1.60	3.00	4.80	FACHADA
0.85	0.20	0.17	FACHADA
1.00	0.40	0.40	FACHADA
1.60	1.60	2.56	DESCONTAR
1.60	1.60	2.56	DESCONTAR
1.60	1.60	2.56	DESCONTAR
1.60	1.20	1.92	DESCONTAR
1.20	0.80	0.96	DESCONTAR

TOTAL **213.85**

RUBRO: PUERTAS

NUMERO	UBICACIÓN
2.00	BAÑOS

RUBRO: CERAMICA PARA PISO

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
2.27	1.50	3.41	BAÑO
1.40	1.18	1.65	BAÑO
1.40	1.05	1.47	BAÑO
0.13	0.60	0.08	BAÑO
0.13	0.60	0.08	BAÑO

TOTAL **6.68**

RUBRO: PUERTA METALICA

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
1.90	3.10	5.89	ENTRADA PRINCIPAL

TOTAL **5.89**

RUBRO: VIDRIO CLARO DE 4MM

L(m)	A(m)	AREA(m2)	UBICACIÓN
0.48	0.73	0.35	VENTANAS
0.48	0.73	0.35	VENTANAS
0.57	1.08	0.62	VENTANAS
0.49	1.09	0.53	VENTANAS
0.51	0.75	0.38	VENTANAS
0.49	1.10	0.54	VENTANAS
0.49	1.10	0.54	VENTANAS
0.49	0.98	0.48	VENTANAS
0.98	0.35	0.34	VENTANAS
1.00	0.32	0.32	VENTANAS
1.00	0.32	0.32	VENTANAS
TOTAL		4.77	

RUBRO: ARREGLO DE CUBIERTA-BAJANTES-CANALES

L(m)	A(m)	AREA	UBICACIÓN
53.20	1.20	63.84	CUBIERTA

RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACION INODOROS

41.

NUMERO	UBICACIÓN
2.00	BAÑOS

RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS

NUMERO	UBICACIÓN
1.00	BAÑOS

RUBRO: ILUMINACION

NUMERO	UBICACIÓN
1.00	BAÑOS
2.00	COMEDOR
1.00	COCINA
TOTAL	4.00

41.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS INFIMA CUANTIA

Acta de Entrega y Recepción Única de la obra: “ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA”, ejecutado por el Sr. Segundo Chimbo Ninabanda, previa orden de trabajo N.-24-DOP-GADCG, de fecha 14 de Noviembre del 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los 29 días del mes de Noviembre del dos mil veinte y dos, comparecen por una parte el **Ing. Civil Fabián Vásconez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el **Ing. Civil Klever David Peñaloza Ulloa en calidad de Observador – Fiscalizador de la obra**, y por otra parte el Sr. Segundo Chimbo Ninabanda, en calidad de contratista del proyecto, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra la obra y proceder a realizar la recepción única de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de Alcalde del Cantón y por otra parte el Señor Segundo Chimbo Ninabanda en calidad de contratista, proceden a construir el Proyecto: “ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA” con la partida presupuestaria N° 00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 correspondiente a Obras de Infraestructura, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista: Sr. Segundo Chimbo Ninabanda
Objeto del contrato ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA

Valor presupuesto original: USD 6.731.91
Fecha de inicio de trabajos: 14 de Noviembre del 2022
Plazo: 15 días calendario, desde la orden de trabajo
Valor del anticipo: USD ninguno
Monto trabajado: USD 6.446.19

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN.-

La Fiscalización informa que la obra objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción única, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación

RUBRO Y CANTIDADES CONTRATADAS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U	PU
1	ARREGLO DE CUBIERTA-BAJANTES-CANALES	280.00	M2	1.19
2	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE CIELO RAZO	200.00	M2	0.23
3	ACCESORIOS DE ARREGLO DE INODOROS	4.00	U	33.07
4	ACCESORIOS DE ARREGLO DE LAVAMANOS	4.00	U	38.92
5	CIELO FALSO DE PVC-TIPO MADERA	200.00	M2	19.54
6	ENLUCIDO PASTEADO COGIDA DE FALLAS	5.00	M2	2.48
7	LUMINARIA FLUORESCENTE DOBLE 40W	8.00	PTO	81.88
8	PINTURA ANTICORROSIVA	50.00	M2	2.18
9	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS LIMPIEZA) SATINADA	200.00	M2	2.45
10	ARREGLO DE PUERTAS	4.00	U	69.19
11	PUERTA METALICA TUBO RECTANGULAR Y VARILLA CUADRADA	5.00	M2	107.63
12	VIDRIO CLARO DE 4MM	5.00	M2	15.08

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADOS

N.-	RUBROS	CANTIDAD	U	PU
1	ARREGLO DE CUBIERTA-BAJANTES-CANALES	63.84	M2	1.19
2	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE CIELO RAZO	0.00	M2	0.23
3	ACCESORIOS DE ARREGLO DE INODOROS	0.00	U	33.07
4	ACCESORIOS DE ARREGLO DE LAVAMANOS	0.00	U	38.92
5	CIELO FALSO DE PVC-TIPO MADERA	158.28	M2	19.54
6	ENLUCIDO PASTEADO COGIDA DE FALLAS	10.00	M2	2.48
7	LUMINARIA FLUORESCENTE DOBLE 40W	8.00	PTO	81.88
8	PINTURA ANTICORROSIVA	17.77	M2	2.18
9	PINTURA DE CAUCHO(DOS MANOS LIMPIEZA) SATINADA	213.85	M2	2.45
10	ARREGLO DE PUERTAS	0.00	U	69.19
11	PUERTA METALICA TUBO RECTANGULAR Y VARILLA CUADRADA	5.89	M2	107.63
12	VIDRIO CLARO DE 4MM	4.77	M2	15.08
13	CANALON DE AGUAS LLUVIAS PVC	53.20	M	10.59
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS	2.00	U	116.90
15	PUERTAS PARA BAÑO 1.80X0.60 MADERA+MDF	2.00	U	127.74
16	CERAMICA PARA PISOS	6.68	M2	16.7
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANO	1.00	U	91.42
18	ILUMINACION	4.00	PTO	18.35

TERCERA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

El Valor trabajado es de \$ 6.446.19

Liquidación que no incluye IVA

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Plazo contratado: 15 días
 Fecha de inicio trabajos: 14 de Noviembre del 2022
 Fecha de entrega de la obra: 28 de Noviembre del 2022
 Ampliaciones autorizadas de plazo: 0 días
 Tiempo empleado: 15 días
 Días de mora: 0 días

QUINTA: RECEPCION DE LA OBRA DE INFIMA CUANTIA

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción, una vez que se ha verificado que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADCG ya que ha sido ejecutada de acuerdo a los planos, especificaciones generales y técnicas y a las cláusulas contractuales.

De conformidad con lo contratado y establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos de: "ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA", quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes componentes de la estructura se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes a la etapa a su cargo.


SEXTA: DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

Ninguna devolución de garantía.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, el 29 de Noviembre del dos mil veinte y dos.


 Ing. Civil Fabián Vásconez

Director de OO.PP.MM del GADCG


 Ing. Civil David Peñaloza

Fiscalizador-Observador


 Sr. Segundo Chimbo Ninabanda
 Contratista del GADCG

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guaranda, 28 de Noviembre del 2022

Oficio N.-0303-DP-GADCG-2022

Ingeniero

Fabián Vásconez Ch.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL GADC-G

En su despacho.-

De mi consideración:

En referencia a la orden de trabajo N.-24-DOP-GADCG, de fecha 14 de Noviembre del 2022, suscrita entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda y el Sr. Segundo Chimbo Ninabanda, para la ejecución de la obra " ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA"; debo indicar lo siguiente:

INFORME DE LA FISCALIZACION DE INFIMA CUANTIA

INFORME No.	1
Fecha de presentación	28-Noviembre -2022
Periodo de trabajo	14-NOVIEMBRE-22 HASTA 28-NOVIEMBRE DEL 2022
Fiscalizador	Ing. Civil David Peñaloza Ulloa
Proyecto	ADECENTAMIENTO DE LA CASA ARTESANAL DE LA COMUNIDAD DE PIRCAPAMBA
Entidad contratante	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.
Contratista	Sr. Segundo Chimbo Ninabanda
Orden de trabajo	24-DOP-GADCG
Fecha de Orden de Trabajo	14-NOVIEMBRE-2022
Fecha de terminación de los trabajos	28-NOVIEMBRE-2022
Monto del Proyecto	\$ 6.731.91
Monto trabajado en este periodo	\$ 6.446.19
Monto trabajado acumulado	\$ 6.446.19
% de avance este periodo	100 %
Plazo contractual	15 días
Multas	Ninguna
Estado general de tiempo	SOLEADO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.-

- Arreglo Cubierta-Bajantes-Canales
- Cielo Falso de PVC-tipo madera
- Enlucido pasteado cogida de fallas
- Luminarias Fluorescentes
- Pintura anticorrosiva
- Pintura de caucho-satinada
- Puerta metálica
- Vidrios claro 4mm
- Canalón de aguas lluvias PVC
- Suministro e instalación de inodoros

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- Puertas para baños, madera + mdf
- Cerámica para pisos
- Suministro e instalación de lavabo
- Iluminación

CONTROL DE CALIDAD.-

Esta Fiscalización ha realizado el control de calidad y así exigiendo al contratista que cumpla con todas las especificaciones y parámetros de calidad en cada uno de los rubros ejecutados en el proyecto.

PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA.-

Se constata la maquinaria y el personal que labora diariamente en el proyecto.


LABOR REALIZADA POR LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.-

Seguimiento del proceso constructivo de la obra, de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del Proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

En los actuales momentos esta obra se encuentra en pleno funcionamiento, brindando la debida funcionabilidad técnica para la que fue contratada.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.




Ing. Civil David Peñaloza Ulloa-Fiscalizador del GADCG



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Adecantamiento de casa artesanal comunidad de Casipamba Parroquia Veintimilla

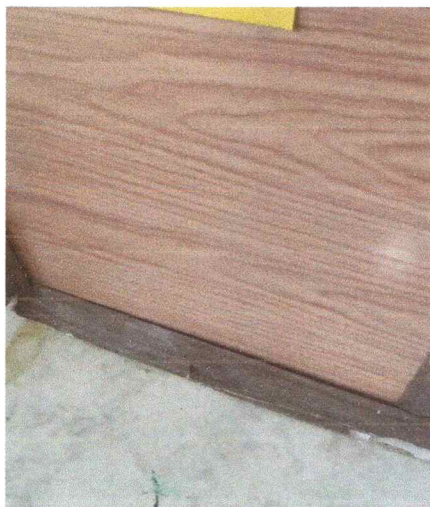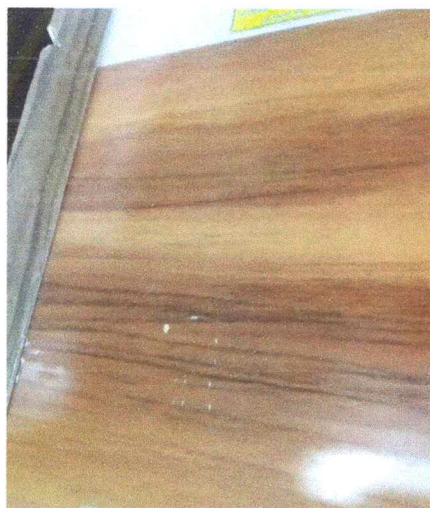

Por Guaranda yo me sumo




Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

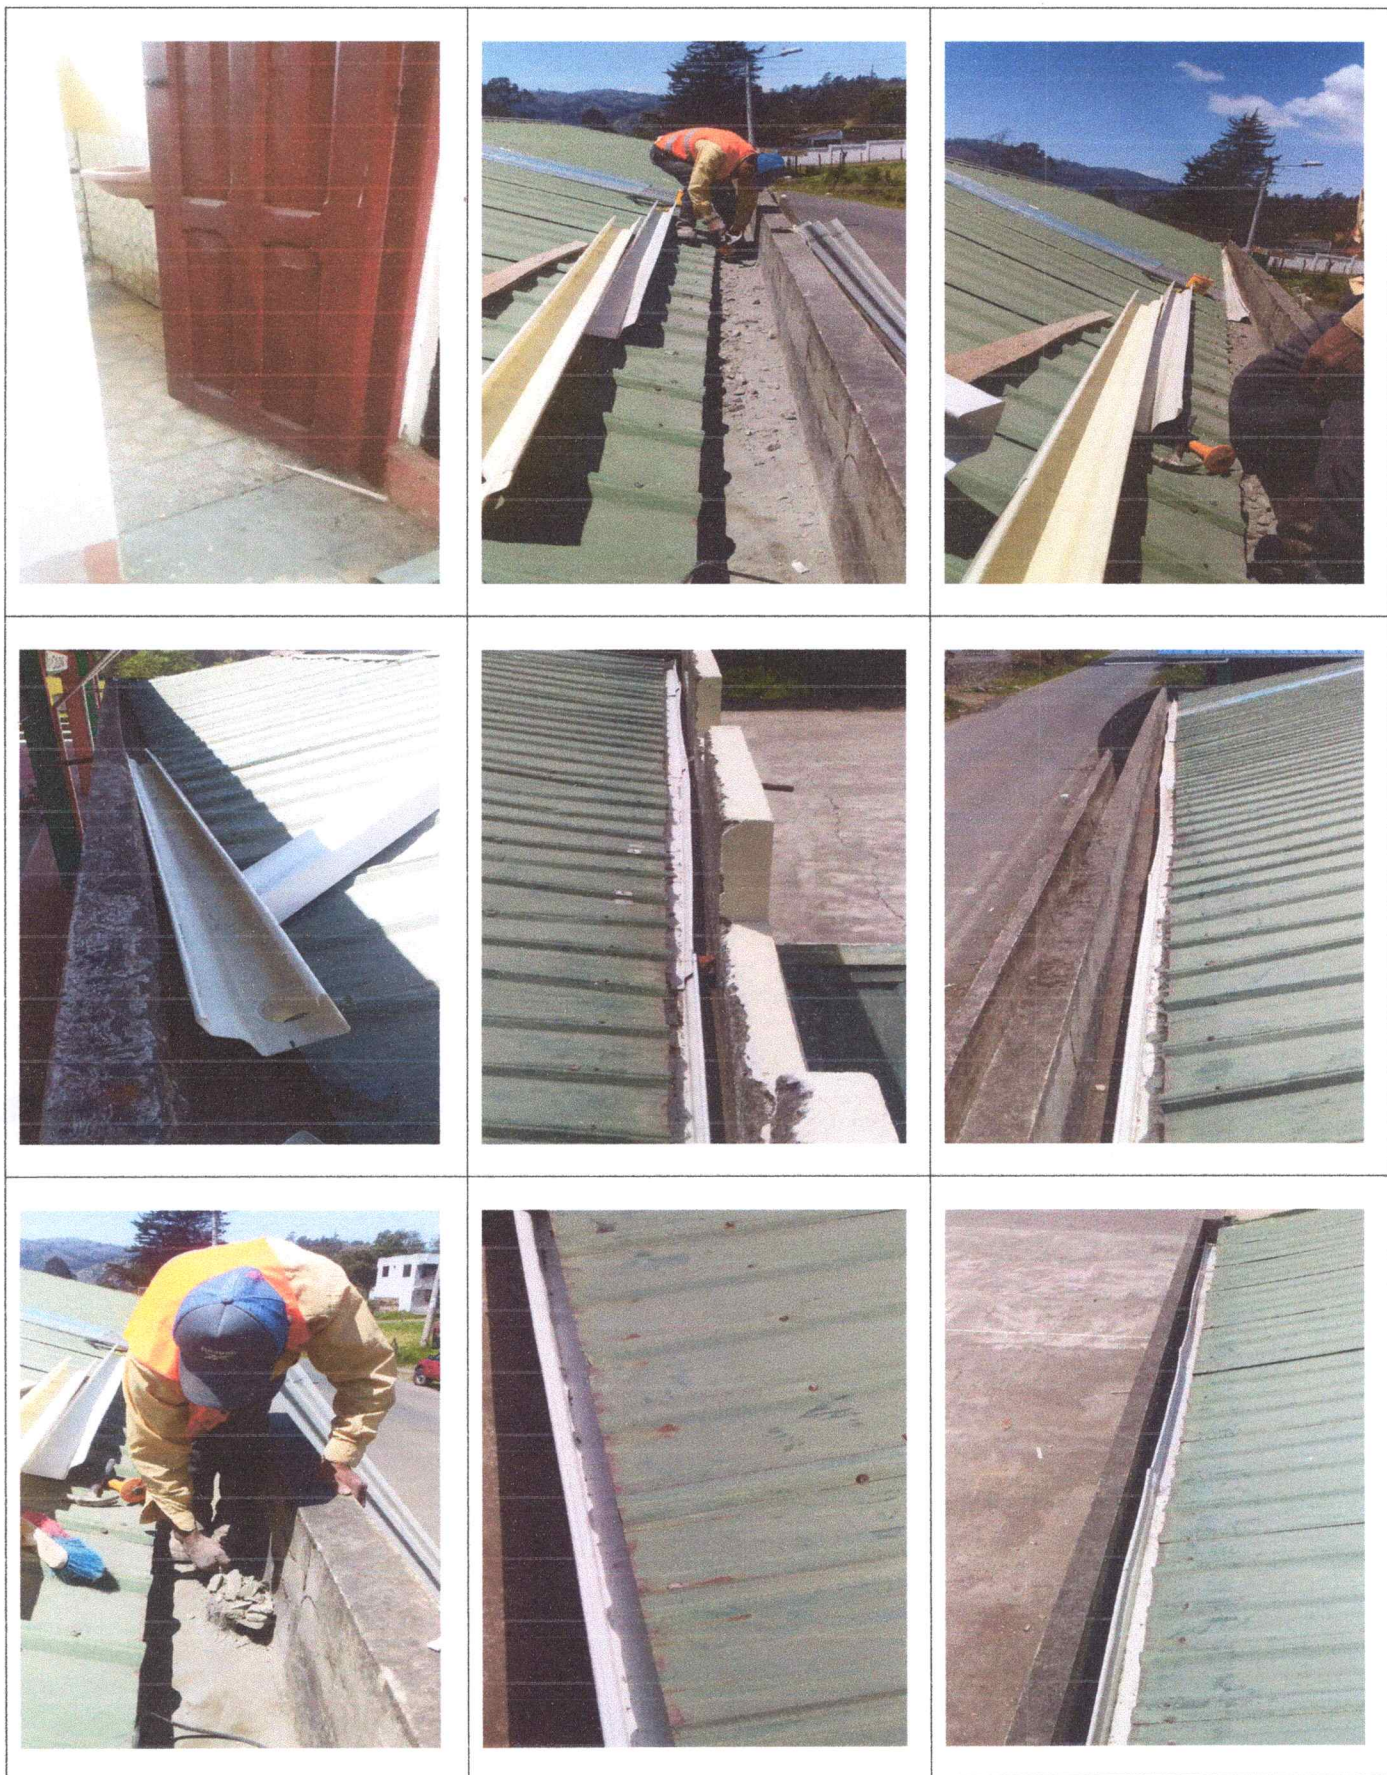

Por Guaranda yo me sumo








Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

Handwritten signature or mark.



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

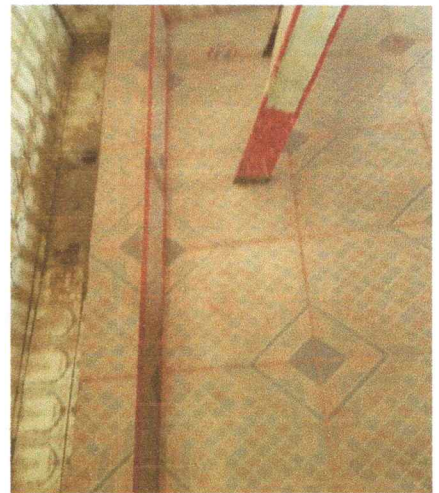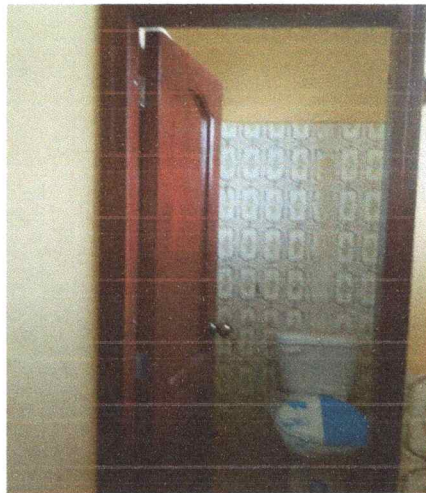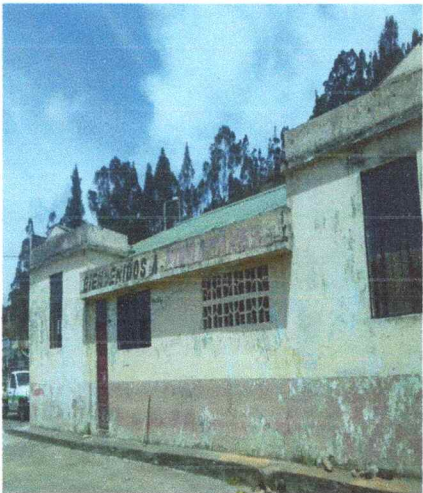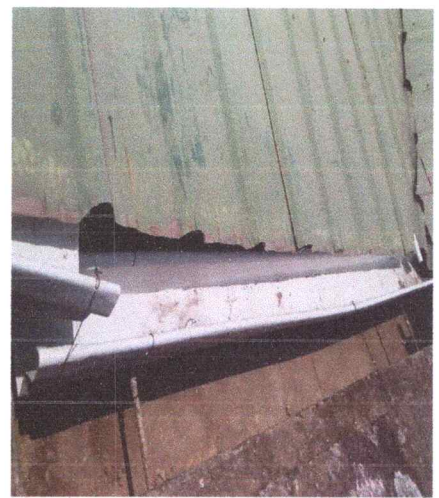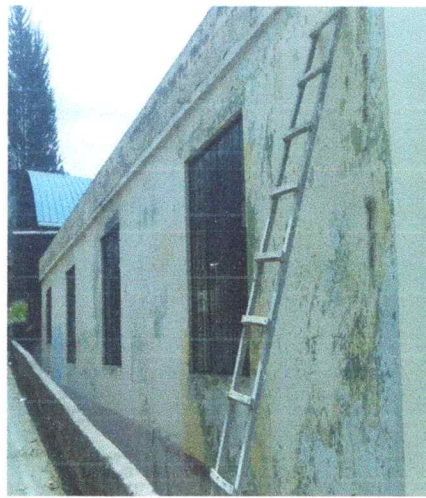

FISCALIZADOR
ING: DAVID PEÑALOZA

CONTRATISTA
SR: SEGUNDO CHIMBO

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

f. /

ESTADÍSTICA DE...



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

f.

