

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio- 701- FCGOR-GADCG

Guaranda, 09 de diciembre de 2022

Ingeniero
ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ.
Director de Obras Públicas Municipales

Presente:

En mi calidad de fiscalizador del proyecto, informo a usted que he realizado el control de la ejecución de los trabajos "TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLES BOLIVAR, JUAN JOSE FLORES, ANGEL POLIBIO CHAVEZ, MONTALVO, GABRIEL VEINTIMILLA, BARRIO SANTA CECILIA PARROQUIA DE SAN LORENZO CANTON GUARANDA", trabajos que se han ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la orden de trabajo y las recomendaciones de la fiscalización, por lo que se ha procedido a cuantificar los diferentes rubros y elaborar la planilla única, que corresponde al periodo del 17 de noviembre al 9 de diciembre del 2022 de acuerdo a los rubros y cantidades de obra que se detallan en los formatos que se anexan y cuyo monto asciende a la cantidad de **USD 4.928,42 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO , 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) sin el IVA**

PLANILLA UNICA:	CANTIDAD TRABAJADA	TOTAL+IVA
VALOR PLANILLA UNICA:	\$ 4.928,42	\$ 4,928.42
IVA:		\$ 591.41
TOTAL	\$ 4.928,42	\$ 5,519.83

Por lo anotado, informo a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla única, a nombre del maestro: **Pascual Agualongo Agualongo**, contratista y responsable de los trabajos, según orden de trabajo No.-025-DOP-GADCG suscrito el 17 de noviembre del 2022.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente;



ING. CARLOS OROZCO RUIZ.
Fiscalizador Municipal

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRAS

PROYECTO: PARROQUIA SAN LORENZO												
CONTRATISTA: Sr. PASCUAL AGUALONGO AGUALONGO												
ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLES JUAN JOSE FLORES, ANGEL POLIVIO CHAVEZ, MONTALVO, GABRIEL VEINTIMILLA												
PERIODO 17 NOVIEMBRE-9 DICIEMBRE 2022												
POR: 4,928.42 USD												
TIPO CONTRATO: OBRA CIERTA												
RUBRO Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	ADOQUINADO Y DESADOQUINADO	M2	2.45	773.02	-	203.68	203.68	-	499.02	499.02	1,893.90	
2	RAZANTEO ZANJA	ML	0.44	500.00	-	369.90	369.90	-	162.76	162.76	220.00	
3	COLOCACION TUBERIA 400MM	ML	2.01	500.00	-	380.15	380.15	-	764.10	764.10	1,005.00	
4	POZOS DE REVISION MANO DE OBRA	U	97.88	5.00	-	4.00	4.00	-	391.52	391.52	489.40	
5	SUMIDEROS	U	42.20	20.00	-	8.00	8.00	-	337.60	337.60	844.00	
6	RELLENO	M3	2.22	250.00	-	219.79	219.79	-	487.93	487.93	555.00	
7	ARREGLOS ACOMETIDA SANITARIA	U	4.46	80.00	-	-	-	-	-	-	356.80	
8	ARREGLOS VARIOS ACOMETIDA DE AGUA	U	4.46	40.00	-	-	-	-	-	-	178.40	
9	ACERO DE REFUERZO	KG	0.44	850.00	-	-	-	-	-	-	374.00	
10	ENCOFRADO DESENCOFRADO	M2	0.89	250.00	-	6.40	6.40	-	5.70	5.70	222.50	
11	TUBERIA 160-200MM	ML	0.89	180.00	-	-	-	-	-	-	160.20	
12	TUBERIA PVC 32*1.00 E/C	ML	0.77	12.00	-	12.00	12.00	-	9.24	9.24	9.24	
13	TUBERIA PVC 63*1.00 E/C	ML	2.35	18.00	-	18.00	18.00	-	42.30	42.30	42.30	
14	TUBERIA PVC 90*1.00 E/C	ML	3.98	42.00	-	42.00	42.00	-	167.16	167.16	167.16	
15	ADAPTADOR FLEX 1/2"	U	0.14	10.00	-	10.00	10.00	-	1.40	1.40	1.40	
16	ABRAZADERAS 1/2"	U	0.83	70.00	-	70.00	70.00	-	58.10	58.10	58.10	
17	UNION FLEX 1/2"	U	0.13	40.00	-	40.00	40.00	-	5.20	5.20	5.20	
18	UNION PVC 32MM	U	0.50	6.00	-	6.00	6.00	-	3.00	3.00	3.00	
19	UNION PVC 63MM	U	1.60	4.00	-	4.00	4.00	-	6.40	6.40	6.40	
20	UNION PVC 90MM	U	5.61	5.00	-	5.00	5.00	-	28.05	28.05	28.05	
21	COLLARIN PVC 90-1/2"	U	6.15	3.00	-	3.00	3.00	-	18.45	18.45	18.45	
22	MANGUERA 1/2"	ML	0.36	90.00	-	90.00	90.00	-	32.40	32.40	32.40	
23	ADAPTADOR PVC 2" - 63MM	U	5.50	5.00	-	5.00	5.00	-	27.50	27.50	27.50	
24	ADAPTADOR PVC 3" -90MM	U	7.70	7.00	-	7.00	7.00	-	53.90	53.90	53.90	
25	CODO PVC 4" - 90	U	2.20	1.00	-	1.00	1.00	-	2.20	2.20	2.20	
26	TUBO PVC DESAGUE 4"	U	8.69	1.00	-	1.00	1.00	-	8.69	8.69	8.69	
27	EXCAVACION A MAQUINA	M3	3.50	163.53	-	163.53	163.53	-	572.36	572.36	-	
28	POZOS DE REVISION MATERIALES h=3.30	U	450.00	1.00	-	1.00	1.00	-	450.00	450.00	-	
29	INSTALDA DE REJILLAS	U	15.00	-	-	5.00	5.00	-	75.00	75.00	-	
30	ENCOFRADO DESENCOFRADO MATERIALES	M2	7.50	-	-	86.46	86.46	-	648.45	648.45	-	
31	LIMPIEZA SUMIDEROS	U	10.00	-	-	7.00	7.00	-	70.00	70.00	-	
TOTALES				-	-	4,928.42	4,928.42	-	6,763.19	6,763.19	-	
Anticipo				0%	-	0.00	0	-	13,528.34	13,528.34	-	
MULTAS				-	-	0	0	-	0	0	-	
FISCALIZAC.				-	-	0	0	-	0	0	-	
ESCALAFON				-	-	0	0	-	0	0	-	
VALOR ESTA PLANILLA				-	-	4,928.42	4,928.42	-	591.41	591.41	-	
I V A				12%	-	591.41	591.41	-	5,519.83	5,519.83	-	
LIQUIDO				-	-	-	-	-	-	-	-	


ING. FABIAN VASQUEZ CHAVEZ
DIRECTOR OO.PP.MM


ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR


Sr. PASCUAL AGUALONGO AGUALONGO
CONTRATISTA


Guarandía
ALCALDÍA



ING. FABIAN VASCONEZ CHAVEZ
DIRECTOR OO.PP.MM

ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR

Sr. PASCUAL AGUALONGO AGUALONGO
CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS
ÍNFIMA CUANTÍA**

Acta de Entrega y Recepción Definitiva de la ejecución de los: **“TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLES BOLIVAR, JUAN JOSE FLORES, ANGEL POLIBIO CHAVEZ, MONTALVO, GABRIEL VEINTIMILLA, BARRIO SANTA CECILIA PARROQUIA DE SAN LORENZO”** ejecutado por el maestro Pascual Agualongo Agualongo, previa orden de trabajo No.- 025-DOP-GADCG del 17 de noviembre del 2020 emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los nueve días del mes de diciembre del 2022, comparece por una parte el Ing. Alex Fabián Vasconez Chávez, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el Ing. Carlos Orozco Ruiz en calidad de Fiscalizador de los trabajos, y por otra parte el maestro: Pascual Agualongo Agulongo en calidad de contratista de los trabajos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra los trabajos y proceder a realizar la recepción definitiva de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de Alcalde del Cantón y por otra parte el maestro Pascual Agualongo Agualongo en calidad de contratista, proceden a realizar los: **“TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLES BOLIVAR, JUAN JOSE FLORES, ANGEL POLIBIO CHAVEZ, MONTALVO, GABRIEL VEINTIMILLA, BARRIO SANTA CECILIA PARROQUIA DE SAN LORENZO”** con la partida presupuestaria N° 00.00.003.361.750107.02.01.0.100 correspondiente “Juntas Parroquiales”, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	Maestro: Pascual Agualongo Agualongo
Objeto del contrato:	“TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLES BOLIVAR, JUAN JOSE FLORES, ANGEL POLIBIO CHAVEZ, MONTALVO, GABRIEL VEINTIMILLA, BARRIO SANTA CECILIA PARROQUIA DE SAN LORENZO”
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-025-DOP-GADCG de fecha 17 de noviembre del 2022
Plazo:	30 días calendario, desde la orden de trabajo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN. -

La fiscalización informa que los trabajos objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas, contractuales; con resultados satisfactorios, emitiendo la fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción provisional, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación:

RUBROS Y CANTIDADES TRABAJADAS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	ESTE	ESTE
Nº			UNIT.	PERIODO CANTIDAD	PERIODO TOTAL
1	ADOQUINADO Y DESADOQUINADO	M2	2.45	203.68	499.02
2	RAZANTEO ZANJA	ML	0.44	369.90	162.76
3	COLOCACION TUBERIA 400MM	ML	2.01	380.15	764.10
4	POZOS DE REVISION MANO DE OBRA	U	97.88	4.00	391.52
5	SUMIDEROS	U	42.20	8.00	337.60
6	RELLENO	M3	2.22	219.79	487.93
10	ENCOFRADO DESENCOFADO	M2	0.89	6.40	5.70
12	TUBERIA PVC 32*1.00 E/C	ML	0.77	12.00	9.24
13	TUBERIA PVC 63*1.00 E/C	ML	2.35	18.00	42.30
14	TUBERIA PVC 90*1.00 E/C	ML	3.98	42.00	167.16
15	ADAPTADOR FLEX 1/2"	U	0.14	10.00	1.40
16	ABRAZADERAS 1/2"	U	0.83	70.00	58.10
17	UNION FLEX 1/2"	U	0.13	40.00	5.20
18	UNION PVC 32MM	U	0.50	6.00	3.00
19	UNION PVC 63MM	U	1.60	4.00	6.40
20	UNION PVC 90MM	U	5.61	5.00	28.05
21	COLLARIN PVC 90-1/2"	U	6.15	3.00	18.45
22	MANGUERA 1/2"	ML	0.36	90.00	32.40
23	ADAPTADOR PVC 2" - 63MM	U	5.50	5.00	27.50
24	ADAPTADOR PVC 3" - 90MM	U	7.70	7.00	53.90
25	CODO PVC 4" - 90	U	2.20	1.00	2.20
26	TUBO PVC DESAGUE 4"	U	8.69	1.00	8.69
27	EXCAVACION A MAQUINA	M3	3.50	163.53	572.36
28	POZOS DE REVISION MATERIALES h=3.30	U	450.00	1.00	450.00
29	INSTALDA DE REJILLAS	U	15.00	5.00	75.00
30	ENCOFRADO DESENCOFADO MATERIALES	M2	7.50	86.46	648.45
31	LIMPIEZA SUMIDEROS	U	10.00	7.00	70.00
				TOTALES	4,928.42

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

El Valor trabajado es de \$ 4,928.42 dólares

Liquidación no incluye IVA.

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo contratado:	30 días
Fecha de inicio trabajos:	orden trabajo No.-025-DOP-GADCG del 17 de noviembre de 2022
Fecha de entrega de la obra:	9 de diciembre del 2022 con oficio s/n del maestro Pascual Agualongo quien da a conocer la terminación de los trabajos de alcantarillado pluvial en la parroquia San Lorenzo.
Tiempo empleado:	23 días

QUINTO: RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ÍNFIMA CUANTÍA

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción definitiva, una vez que se ha verificado que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADC-G ya que ha sido ejecutada de acuerdo a las, especificaciones generales y técnicas.

De conformidad en lo establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos: **“TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLES BOLIVAR, JUAN JOSE FLORES, ANGEL POLIBIO CHAVEZ, MONTALVO, GABRIEL VEINTIMILLA, BARRIO SANTA CECILIA PARROQUIA DE SAN LORENZO”** quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción Definitiva, los diferentes trabajos se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos **“TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLES BOLIVAR, JUAN JOSE FLORES, ANGEL POLIBIO CHAVEZ, MONTALVO, GABRIEL VEINTIMILLA, BARRIO SANTA CECILIA PARROQUIA DE SAN LORENZO”**.


SEXTA: OBSERVACIONES: Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción o vicio oculto que aparecieran en los trabajos, de acuerdo a la ley civil.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. -

Ninguna devolución de garantía.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil veinte y dos.



ING. ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OO. PP. MM.



ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR



Maestro: PASCUAL AGUALONGO AGUALONGO
CONTRATISTA



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Por Guaranda yo me sumo




Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

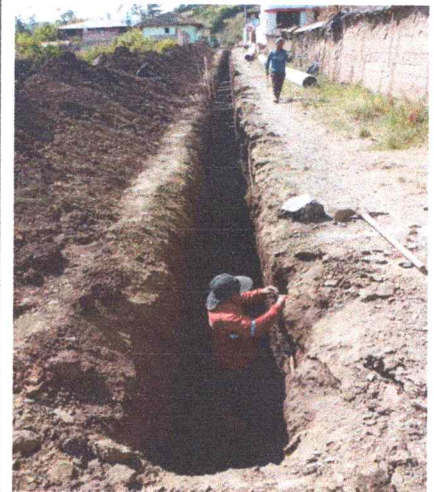

Por Guaranda yo me sumo




Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

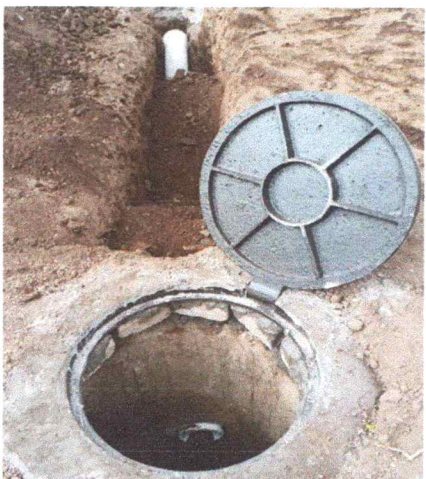

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec
