



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N° 241 – Técnico. O. P. M
Guaranda, 25/04/2022

Ingeniero.

GALO PATÍN

Director de Obras Públicas Municipales

Presente.-

De mi consideración:

En atención al **OFICIO N° 0361-DOP-GADCG-22**, en el cual me nombran como fiscalizado por medio de esto le informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución de la obra: **“REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDADELA LAS COLINAS BORDILLOS Y ACERAS”**, el cual se encuentra ubicado en la ciudadela las Colinas.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: Sr. Segundo Vallejo Toalombo

Orden de Trabajo N°: 05-DOP-GADCG

Fecha de suscripción: 11 de abril del 2022

Monto del Presupuesto: \$ 4361.72 USD incluye IVA

Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo

Porcentaje del anticipo %: 0

Plazo: 15 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 25 de abril del 2022

Días Trabajados: 14 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Sr. Segundo Vallejo Toalombo, cuya liquidación es de **\$3894.39** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO O. P. MUNICIPAL



HORA: 10:20 25 ABR 2022

FIRMA

Por Guaranda y sus rios



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno..
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

COBIOERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA									
PLANILLA:		LIQUIDACIÓN		PERIODO:		2015-ABRIL		MONTOS DE PLANILLA:		1894.39	
OBRA:		REGENERACIÓN URBANA CDLA LAS COLINAS (BORDILLOS Y ACERAS)		MONTOS DE ANTIPO:				MONTOS DE ANTIPO:		0	
UBICACIÓN:		CIUDADELA LAS COLINAS		FECHA DE INICIO:		1-abr-22		FECHA DE INICIO:			
MONTOS DE:		1894.39		PROCESO:		MAYO DE OBRA		AMPLIACIÓN DE PLAZO:		TRABAJOS POR DESTAJO	
CONTRATISTA:		VALLEJO TOALOMBO SEGUNDO ALFREDO		CANTIDADES		IMPORTES		CONTRA ENTREGA:		% A LA OBSERVACIONES	
RUBRO Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA ANTERIOR	TOTAL A LA FECHA	PRESTUPUESTO	% A LA FECHA	OBSERVACIONES
1	HORMIGON S fce210 kg cm ³ SIN ENCOFRADO	M3	125.65	22.00		19.54	19.54	2455.09	2764.30		
2	MASILLADO DE ACERAS Y BORDILLOS	M2	7.55	32.00		30.87	30.87	233.08	241.60		
3	DERROCADA DE HORMIGON	M2	1.82	275.00		334.83	334.83	609.40	500.50		
4	EMPEDRADO DE ACERA	M2	3.36	22.00		24.23	24.23	81.42	73.92		
5	ENCOFRADO DESEN MADERA	M2	6.47	110.00		79.66	79.66	515.41	711.70		
				TOTALES		3894.39		3894.39		4361.72	
				ANTIPO:		0%		0			
				MULTAS:		0%		0			
				RET FUENTE:		0%		0			
				VALOR ESTA PLANILLA		3894.39		3894.39			
				IVA		467.33		467.33			
				LIQUIDO		4361.72		4361.72			
DIRECTOR DE OOP/PMI		FISCALIZADOR		CONTRATISTA		SR SEGUNDO VALLEJO					
ING GALO PATIN		ING ELIZABETH INGA									



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMANO EN EL PASAJE COMUNAL DE LA CD.LA JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE GUARANDA
UBICACIÓN:	CIUDAD LA JUAN XXIII EN LA CALLE GARCIA MORENO Y ADDON CALDERON



RITROS	MEDIDAS (M)			Area (M2)	VOLUMENES		Total	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal		
	10.00	0.10	0.17			0.17		
	2.00	0.10	0.17			0.03		
	4.00	0.10	0.17			0.07		
	3.40	0.10	0.11			0.04		
	10.00	0.10	0.09			0.14		
	12.00	0.10	0.10			0.15		
	0.20	0.10	0.15			0.00		
	0.20	0.10	0.15			0.00		
	19.00	0.10	0.08			0.11		
	0.20	0.10	0.10			0.01		
	4.45	0.10	0.09			0.04		
	2.00	0.10	0.11			0.02		
	0.40	0.10	0.11			0.08		
	3.20	0.10	0.11			0.04		
	8.00	0.10	0.10			0.09		
	8.15	0.10	0.14			0.12		
	14.20	0.10	0.14			0.20		
	0.42	0.10	0.14			0.01		
	3.20	0.10	0.47			0.15		
	2.10	0.10	0.50			0.02		
	1.50	0.10	0.12			0.02		
	4.00	0.10	0.12			0.05		
	0.15	0.10	0.13			0.00		
	5.00	0.10	0.12			0.06		
	2.20	0.10	0.09			0.02		
	0.30	0.10	0.00			0.00		
	4.00	0.10	0.07			0.03		
	2.00	0.10	0.10			0.08		
	2.00	0.10	0.14			0.02		
	17.50	0.09	0.15			0.26		
	19.70	0.09	0.15			0.30		
	1.70	0.10	0.18			0.03		
	0.70	0.10	0.14			0.01		
	3.70	0.10	0.10			0.04		
	0.45	0.10	0.20			0.01		
	13.00	0.10	0.17			0.22		
	0.70	0.10	0.16			0.01		
	24.50	0.10	0.11			0.26		
	2.10	0.10	0.10			0.02		
	8.20	0.17	0.05			0.14		
	1.00	0.17	0.04			0.01		
	0.50	0.20	0.10			0.01		
	0.55	0.17	0.10			0.01		
	11.00	0.17	0.10			0.19		
	2.00	0.04	0.10			0.01		
	14.40	0.10	0.10			0.15		
	6.70	0.05	0.10			0.03		
	7.30	0.08	0.10			0.06		
	0.00	0.04	0.10			0.00		
	20.00	0.04	0.10			0.02		
	10.90	0.10	0.10			0.08		
	27.00	0.10	0.10			0.11		
	3.50	0.05	0.10			0.02		
	1.00	0.07	0.10			0.01		
	11.40	0.12	0.10			0.15		
	20.50	0.10	0.10			0.21		
	10.00	0.17	0.10			0.17		
	4.00	0.10	0.10			0.04		
	17.00	0.12	0.10			0.21		
	2.40	0.05	0.10			0.01		
	0.30	0.10	0.10			0.01		
	17.00	0.15	0.10			0.02		
	2.00	0.12	0.10			0.01		
	3.50	0.20	0.10			0.03		
	11.50	0.04	0.10			0.06		
	14.40	0.08	0.10			0.12		
	7.70	0.12	0.10			0.09		
	20.00	0.28	0.10			0.56		
	4.00	0.30	0.10			0.12		
	13.75	0.15	0.10			0.18		
	2.50	0.17	0.10			0.03		
	7.00	0.10	0.10			0.02		
	7.50	0.17	0.10			0.09		
	1.00	0.12	0.10			0.01		
	17.00	0.09	0.10			0.16		
	12.70	0.17	0.10			0.13		
	3.00	0.10	0.10			0.03		
	1.40	0.15	0.10			0.02		
	1.25	0.15	0.20			0.03		
	18.20	0.15	0.05			0.15		
	10.50	0.12	0.10			0.13		
	6.00	0.19	0.20			0.06		
	10.00	0.12	0.10			0.12		
	11.00	0.08	0.10			0.09		
	8.00	0.07	0.10			0.06		
	0.40	0.25	0.10			0.01		
	7.00	0.06	0.10			0.04		
	8.40	0.10	0.10			0.08		
	7.00	0.10	0.10			0.02		
	13.15	0.10	0.10			0.12		
	18.00	0.12	0.10			0.22		

BORMIGON S. f=10 kg/cm2 SEN
ENCORRADO BORDELLOS

10.54

Por Guaranda yo me siento



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) - 551088 - 551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

2.00	0.41	0.01	0.01
0.12	0.43	0.02	0.02
0.11	0.44	0.03	0.03
0.05	0.45	0.04	0.04
1.11	0.46	0.05	0.11
0.17	0.47	0.06	0.07
0.15	0.48	0.07	0.05
0.70	0.49	0.08	0.50
0.12	0.50	0.09	0.06
1.11	0.51	0.10	0.08
0.06	0.52	0.11	0.11
1.41	0.53	0.12	0.11
0.12	0.54	0.13	0.07
0.13	0.55	0.14	0.06
1.10	0.56	0.15	0.11
1.41	0.57	0.16	0.11
0.12	0.58	0.17	0.07
0.13	0.59	0.18	0.06
1.10	0.60	0.19	0.11
1.41	0.61	0.20	0.11
0.12	0.62	0.21	0.07
0.13	0.63	0.22	0.06
1.10	0.64	0.23	0.11
1.41	0.65	0.24	0.11
0.12	0.66	0.25	0.07
0.13	0.67	0.26	0.06
1.10	0.68	0.27	0.11
1.41	0.69	0.28	0.11
0.12	0.70	0.29	0.07
0.13	0.71	0.30	0.06
1.10	0.72	0.31	0.11
1.41	0.73	0.32	0.11
0.12	0.74	0.33	0.07
0.13	0.75	0.34	0.06
1.10	0.76	0.35	0.11
1.41	0.77	0.36	0.11
0.12	0.78	0.37	0.07
0.13	0.79	0.38	0.06
1.10	0.80	0.39	0.11
1.41	0.81	0.40	0.11
0.12	0.82	0.41	0.07
0.13	0.83	0.42	0.06
1.10	0.84	0.43	0.11
1.41	0.85	0.44	0.11
0.12	0.86	0.45	0.07
0.13	0.87	0.46	0.06
1.10	0.88	0.47	0.11
1.41	0.89	0.48	0.11
0.12	0.90	0.49	0.07
0.13	0.91	0.50	0.06
1.10	0.92	0.51	0.11
1.41	0.93	0.52	0.11
0.12	0.94	0.53	0.07
0.13	0.95	0.54	0.06
1.10	0.96	0.55	0.11
1.41	0.97	0.56	0.11
0.12	0.98	0.57	0.07
0.13	0.99	0.58	0.06
1.10	1.00	0.59	0.11
1.41	1.01	0.60	0.11
0.12	1.02	0.61	0.07
0.13	1.03	0.62	0.06
1.10	1.04	0.63	0.11
1.41	1.05	0.64	0.11
0.12	1.06	0.65	0.07
0.13	1.07	0.66	0.06
1.10	1.08	0.67	0.11
1.41	1.09	0.68	0.11
0.12	1.10	0.69	0.07
0.13	1.11	0.70	0.06
1.10	1.12	0.71	0.11
1.41	1.13	0.72	0.11
0.12	1.14	0.73	0.07
0.13	1.15	0.74	0.06
1.10	1.16	0.75	0.11
1.41	1.17	0.76	0.11
0.12	1.18	0.77	0.07
0.13	1.19	0.78	0.06
1.10	1.20	0.79	0.11
1.41	1.21	0.80	0.11
0.12	1.22	0.81	0.07
0.13	1.23	0.82	0.06
1.10	1.24	0.83	0.11
1.41	1.25	0.84	0.11
0.12	1.26	0.85	0.07
0.13	1.27	0.86	0.06
1.10	1.28	0.87	0.11
1.41	1.29	0.88	0.11
0.12	1.30	0.89	0.07
0.13	1.31	0.90	0.06
1.10	1.32	0.91	0.11
1.41	1.33	0.92	0.11
0.12	1.34	0.93	0.07
0.13	1.35	0.94	0.06
1.10	1.36	0.95	0.11
1.41	1.37	0.96	0.11
0.12	1.38	0.97	0.07
0.13	1.39	0.98	0.06
1.10	1.40	0.99	0.11
1.41	1.41	1.00	0.11
0.12	1.42	1.01	0.07
0.13	1.43	1.02	0.06
1.10	1.44	1.03	0.11
1.41	1.45	1.04	0.11
0.12	1.46	1.05	0.07
0.13	1.47	1.06	0.06
1.10	1.48	1.07	0.11
1.41	1.49	1.08	0.11
0.12	1.50	1.09	0.07
0.13	1.51	1.10	0.06
1.10	1.52	1.11	0.11
1.41	1.53	1.12	0.11
0.12	1.54	1.13	0.07
0.13	1.55	1.14	0.06
1.10	1.56	1.15	0.11
1.41	1.57	1.16	0.11
0.12	1.58	1.17	0.07
0.13	1.59	1.18	0.06
1.10	1.60	1.19	0.11
1.41	1.61	1.20	0.11
0.12	1.62	1.21	0.07
0.13	1.63	1.22	0.06
1.10	1.64	1.23	0.11
1.41	1.65	1.24	0.11
0.12	1.66	1.25	0.07
0.13	1.67	1.26	0.06
1.10	1.68	1.27	0.11
1.41	1.69	1.28	0.11
0.12	1.70	1.29	0.07
0.13	1.71	1.30	0.06
1.10	1.72	1.31	0.11
1.41	1.73	1.32	0.11
0.12	1.74	1.33	0.07
0.13	1.75	1.34	0.06
1.10	1.76	1.35	0.11
1.41	1.77	1.36	0.11
0.12	1.78	1.37	0.07
0.13	1.79	1.38	0.06
1.10	1.80	1.39	0.11
1.41	1.81	1.40	0.11
0.12	1.82	1.41	0.07
0.13	1.83	1.42	0.06
1.10	1.84	1.43	0.11
1.41	1.85	1.44	0.11
0.12	1.86	1.45	0.07
0.13	1.87	1.46	0.06
1.10	1.88	1.47	0.11
1.41	1.89	1.48	0.11
0.12	1.90	1.49	0.07
0.13	1.91	1.50	0.06
1.10	1.92	1.51	0.11
1.41	1.93	1.52	0.11
0.12	1.94	1.53	0.07
0.13	1.95	1.54	0.06
1.10	1.96	1.55	0.11
1.41	1.97	1.56	0.11
0.12	1.98	1.57	0.07
0.13	1.99	1.58	0.06
1.10	2.00	1.59	0.11
1.41	2.01	1.60	0.11
0.12	2.02	1.61	0.07
0.13	2.03	1.62	0.06
1.10	2.04	1.63	0.11
1.41	2.05	1.64	0.11
0.12	2.06	1.65	0.07
0.13	2.07	1.66	0.06
1.10	2.08	1.67	0.11
1.41	2.09	1.68	0.11
0.12	2.10	1.69	0.07
0.13	2.11	1.70	0.06
1.10	2.12	1.71	0.11
1.41	2.13	1.72	0.11
0.12	2.14	1.73	0.07
0.13	2.15	1.74	0.06
1.10	2.16	1.75	0.11
1.41	2.17	1.76	0.11
0.12	2.18	1.77	0.07
0.13	2.19	1.78	0.06
1.10	2.20	1.79	0.11
1.41	2.21	1.80	0.11
0.12	2.22	1.81	0.07
0.13	2.23	1.82	0.06
1.10	2.24	1.83	0.11
1.41	2.25	1.84	0.11
0.12	2.26	1.85	0.07
0.13	2.27	1.86	0.06
1.10	2.28	1.87	0.11
1.41	2.29	1.88	0.11
0.12	2.30	1.89	0.07
0.13	2.31	1.90	0.06
1.10	2.32	1.91	0.11
1.41	2.33	1.92	0.11
0.12	2.34	1.93	0.07
0.13	2.35	1.94	0.06
1.10	2.36	1.95	0.11
1.41	2.37	1.96	0.11
0.12	2.38	1.97	0.07
0.13	2.39	1.98	0.06
1.10	2.40	1.99	0.11
1.41	2.41	2.00	0.11
0.12	2.42	2.01	0.07
0.13	2.43	2.02	0.06
1.10	2.44	2.03	0.11
1.41	2.45	2.04	0.11
0.12	2.46	2.05	0.07
0.13	2.47	2.06	0.06
1.10	2.48	2.07	0.11
1.41	2.49	2.08	0.11
0.12	2.50	2.09	0.07
0.13	2.51	2.10	0.06
1.10	2.52	2.11	0.11
1.41	2.53	2.12	0.11
0.12	2.54	2.13	0.07
0.13	2.55	2.14	0.06
1.10	2.56	2.15	0.11
1.41	2.57	2.16	0.11
0.12	2.58	2.17	0.07
0.13	2.59	2.18	0.06
1.10	2.60	2.19	0.11
1.41	2.61	2.20	0.11
0.12	2.62	2.21	0.07
0.13	2.63	2.22	0.06
1.10	2.64	2.23	0.11
1.41	2.65	2.24	0.11
0.12	2.66	2.25	0.07
0.13	2.67	2.26	0.06
1.10	2.68	2.27	0.11
1.41	2.69	2.28	0.11
0.12	2.70	2.29	0.07
0.13	2.71	2.30	0.06
1.10	2.72	2.31	0.11
1.41	2.73	2.32	0.11
0.12	2.74	2.33	0.07
0.13	2.75	2.34	0.06
1.10	2.76	2.35	0.11
1.41	2.77	2.36	0.11
0.12	2.78	2.37	0.07
0.13	2.79	2.38	0.06
1.10	2.80	2.39	0.11
1.41	2.81	2.40	0.11
0.12	2.82	2.41	0.07
0.13	2.83	2.42	0.06
1.10	2.84	2.43	0.11
1.41	2.85	2.44	0.11
0.12	2.86	2.45	0.07
0.13	2.87	2.46	0.06
1.10	2.88	2.47	0.11
1.41	2.89	2.48	0.11
0.12	2.90	2.49	0.07
0.13	2.91	2.50	0.06
1.10	2.92	2.51	0.11
1.41	2.93	2.52	0.11
0.12	2.94	2.53	0.07
0.13	2.95	2.54	0.06
1.10	2.96	2.55	0.11
1.41	2.97	2.56	0.11
0.12	2.98	2.57	0.07
0.13	2.99	2.58	0.06
1.10	3.00	2.59	0.11
1.41	3.01	2.60	0.11
0.12	3.02	2.61	0.07
0.13	3.03	2.62	0.06
1.10	3.04	2.63	0.11
1.41	3.05	2.64	0.11
0.12	3.06	2.65	0.07
0.13	3.07	2.66	0.06
1.10	3.08	2.67	0.11
1.41	3.09	2.68	0.11
0.12	3.10	2.69	0.07
0.13	3.11	2.70	0.06
1.10	3.12	2.71	0.11
1.41	3.13	2.72	0.11
0.12	3.14	2.73	0.07
0.13	3.15	2.74	0.06
1.10	3.16	2.75	0.11
1.41	3.17	2.76	0.11
0.12	3.18	2.77	0.07
0.13	3.19	2.78	0.06
1.10	3.20	2.79	0.11
1.41	3.21	2.80	0.11
0.12	3.22	2.81	0.07
0.13	3.23	2.82	0.06
1.10	3.24	2.83	0.11
1.41	3.25	2.84	0.11
0.12	3.26	2.85	0.07
0.13	3.27	2.86	0.06
1.10	3.28	2.87	0.11
1.41	3.29	2.88	0.11
0.12	3.30	2.89	0.07
0.13	3.31	2.90	0.06
1.10	3.32	2.91	0.11
1.41	3.33	2.92	0.11
0.12	3.34	2.93	0.07
0.13	3.35	2.94	0.06
1.10	3.36	2.95	0.11
1.41	3.37	2.96	0.11
0.12	3.38	2.97	0.07
0.13	3.39	2.98	0.06
1.10	3.40	2.99	0.11
1.41	3.41	3.00	0.11
0.12	3.42	3.01	0.07
0.13	3.43	3.02	0.06
1.10	3.44	3.03	0.11
1.41	3.45	3.04	0.11
0.12	3.46	3.05	0.07
0.13	3.47	3.06	0.06
1.10			




DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

	18.20	0.675		12.284		12.285	
	1.00	0.57		0.570		0.570	
	0.76	0.45		0.315		0.315	
	72.00	0.14		10.080		10.080	
	2.80	0.10		0.280		0.280	
MASILLADO DE ACERAS Y BORDILLOS	8.50	0.25		2.125		2.125	30.87
	25.00	0.12		3.000		3.000	
	2.00	0.10		0.200		0.200	
	2.20	0.10		0.220		0.220	
	2.60	0.12		0.316		0.316	
	1.00	0.10		0.100		0.100	
	15.60	0.10		1.560		1.560	
DERROCADA DE HORMIGON	544.80	0.75		259		258.70	334.93
	688.03	0.11		76		76.13	
EMPEDRADO DE ACERA	1.10	1.00		1.10		1.10	24.23
	3.50	1.00		3.50		3.50	
	7.30	0.45		3.29		3.29	
	15.45	1.02		15.68		15.68	
	1.80	0.37		0.87		0.87	
ENCOFRADO DESEN. MADERA	688.03	0.12		79.66		79.66	79.66

FISCALIZADOR
ING. ELIZABETH INGA

CONTRATISTA
SR. SEGUNDO VALLEJO



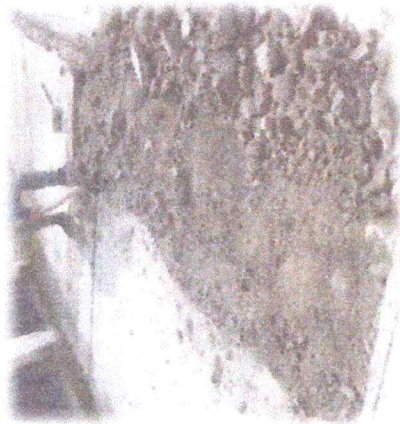

DERROCA DA DE HORMIGÓN



ENCOFRADO - DESENCOFRA DO MADERA


DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS



EMPEDRADO DE ACERAS



FUNDICIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS

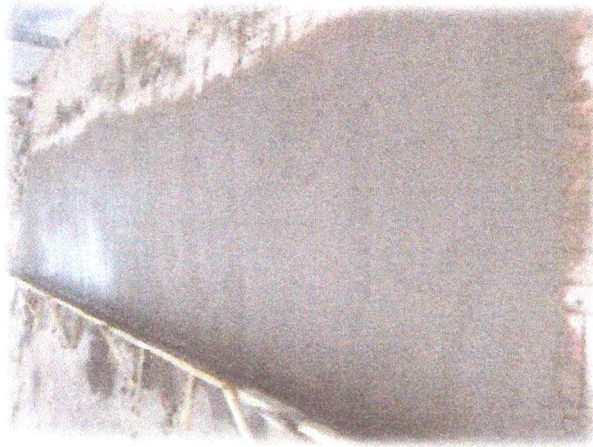

MASILLADO DE ACERAS Y BORDILLOS



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÍNFIMA CUANTÍA

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, "REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDADELA LAS COLINAS (BORDILLOS Y ACERAS)", entregado por el Sr. SEGUNDO VALLEJO TOALOMBO, previo orden de trabajo N° 05-DOP-GADCG, de fecha 11 de abril de 2022, emitida por la Dirección de OO PP.MM. ING. WILIAM MANOBANDA.

En la ciudad de Guaranda a los 25 días del mes de abril del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. GALO PATÍN, Director de Obras Públicas Municipales, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Sr. Segundo Vallejo Toalombo para el proyecto "REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDADELA LAS COLINAS (BORDILLOS Y ACERAS)"; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	HORMIGÓN S. f _c =210 kg/cm ² SIN ENCOFRADO	M3	125.65	19.54	2455.09
2	MASILLADO DE ACERAS Y BORDILLOS	M2	7.55	30.87	233.08
3	DERROCADA DE HORMIGÓN	M2	1.82	334.83	609.40
4	EMPEDRADO DE ACERA	M2	3.36	24.23	81.42
5	ENCOFRADO-DESEN. MADERA	M2	6.47	79.66	515.41
TOTAL PARCIAL					3894.39
IVA 12%					467.33
TOTAL					4361.72

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 11 de abril del 2022

Plazo: 15 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 25 de abril del 2022

Días Trabajados: 14 días, no existe mora





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, "REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDADELA LAS COLINAS (BORDILLOS Y ACERAS)".

Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, "REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDADELA LAS COLINAS (BORDILLOS Y ACERAS)", hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,

Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OO.PP.MM

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO OO.PP.MM

Sr. Segundo Vallejo Toalombo
CONTRATISTA

