



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

Oficio N°360 – Técnico. O. P. M
Guaranda, 13/07/2022

Ingeniero.

GALO PATÍN

Director de Obras Públicas Municipales (e)

Presente.-

De mi consideración:

Informo a usted que he realizado el control y fiscalización de la ejecución: **“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA”**, el cual se encuentra ubicado en la Ciudadela Marcopamba.

1. DATOS INFORMATIVOS:

Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: Ing. Erick Manobanda

Orden de Trabajo N°: 06-A-DOP-GADCG

Fecha de suscripción: 10 de mayo del 2022

Monto del Presupuesto: \$ 6870.91 USD incluye IVA

Fecha de entrega del anticipo: Contra entrega por destajo

Porcentaje del anticipo %: 0

Plazo: 20 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 27 de mayo del 2022

Días Trabajados: 18 días, no existe mora

Por lo anotado, solicito a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla N° 1 de liquidación a nombre del Ing. Erick Manobanda, cuya liquidación es de **\$6134.74** dólares Americanos, sin considerar el IVA, las retenciones lo realizara el Departamento Financiero.

Correspondiente a la Certificación Presupuestaria No: 120, de la partida presupuestaria **00.00.003.361.750104.000.02.01.0.100 DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO.**

Con su mejor criterio señor Director de Obras Públicas por vuestro intermedio solicitar a las autoridades pertinentes para este trámite.

Particular que llevo a su conocimiento para fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS



Por Guaranda y por mi suño



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno..
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

RUBRO 1: REPLANTEO Y NIVELACIÓN



RUBRO 2: EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TIERRA



RUBRO 4: COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL CON VIBROAPISONADOR



**RUBRO 6: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUB
BASE CLASE 3**




RUBRO 7: ENCOFRADO - DESEN. MADERA.



RUBRO 9: HORMIGÓN CICLÓPEO (50% P. H.S. F'C=210 KG/CM² - 50% INCLUYE ENL-MAS-PART VISTAS).



RUBRO 8: PISO DE CANCHA CON MALLA METÁLICA 4 MM (E=0.07).

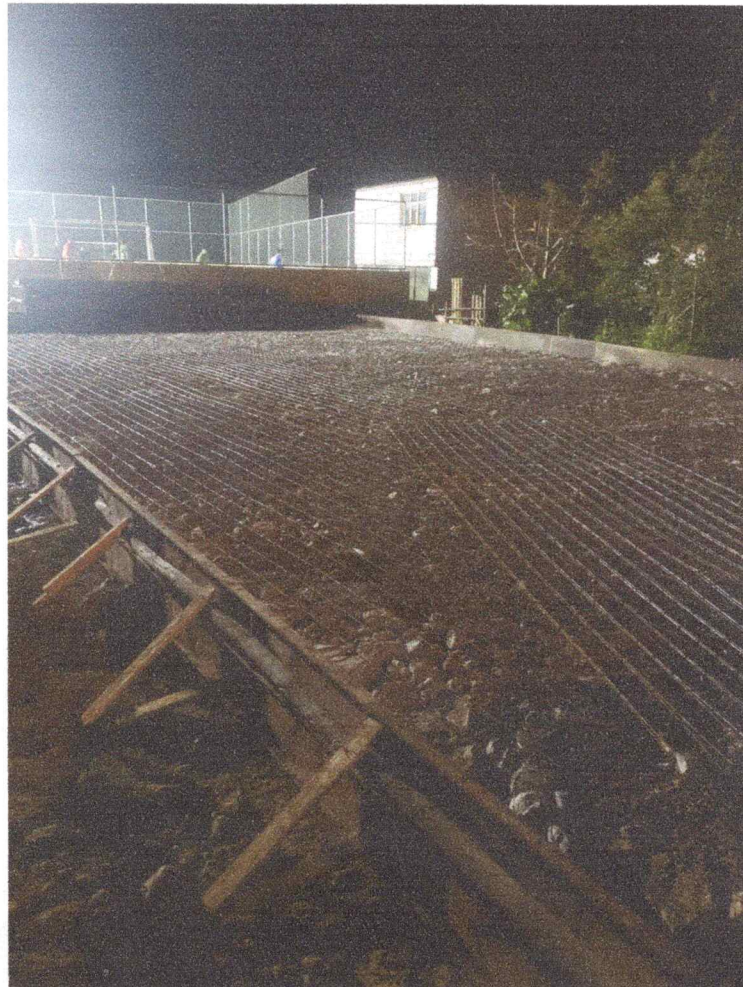





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

RUBRO 10: PINTURA DE CANCHA.

RUBRO 11: PARANTE PARA VOLEY TUBO HG POSTE 3" x 3.50 ML.

RUBRO 12: MALLA PARA VOLEY.



MEMORIA DE CÁLCULO

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA		FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRA										
PLANILLA:		LIQUIDACIÓN		PERIODO:		2022-JULIO		MONTO DE PLANILLA:		6134.74		
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA										
UBICACIÓN:		CIUDADELA MARCOPAMBA										
MONTO DE		6134.74		PROCESO:		MANO DE OBRA		FECHA DE INICIO:		10-may-22		
CONTRATISTA:		ING. ERICK MANOBANDA										
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			IMPORTES			PRESUPUESTO	% A LA FECHA	OBSERVACIONES
				TOTAL CONTRATADO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO			
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1.53	330.00		220.00	220.00		336.60	504.90		
2	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TIERRA	M3	5.83	60.00		19.66	19.66		114.62	349.80		
3	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	7.55	10.00		0.00	0.00		0.00	75.50		
4	COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL CON VIBROAPISONADOR	M3	0.33	50.00		19.02	19.02		6.28	16.50		
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUB	M3	24.06	35.00		35.83	35.83		862.17	842.10		
7	ENCOFRADO - DESEN. MADERA	M2	7.37	24.00		37.12	37.12		273.57	176.88		
9	HORMIGÓN CICLOPEO (50% P. H.S. F'C=210 KG/CM2 - 50% INCLUYE ENL- MAS-PART VISTAS)	M3	83.70	10.00		14.74	14.74		1233.74	837.00		
8	PISO DE CANCHA CON MALLA METÁLICA 4 MM (E=0.07)	M2	14.50	220.00		220.00	220.00		3190.00	3190.00		
10	PINTURA DE CANCHA	ML	0.58	85.00		27.63	27.63		16.02	49.30		
11	PARANTE PARA VOLEY TUBO HG POSTE 3" x 3.50 ML	U	45.35	2.00		2.00	2.00		90.70	90.70		
12	MALLA PARA VOLEY	U	11.04	1.00		1.00	1.00		11.04	11.04		
				TOTALES								
				ANTICIPO:			0%			6134.74		
				MULTAS:						0		
				RET. FUENTE:			0%			0		
				VALOR ESTA PLANILLA						6134.74		
				IVA			12%			736.17		
				LIQUIDO						6870.91		



DIRECTOR DE OO.PP.MM (E)
ING. GALO PATIN



FISCALIZADOR
ING. ELIZABETH INGA



CONTRATISTA
ING. ERICK MANOBANDA

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA						
UBICACIÓN:	CIUDADELA MARCOPAMBA						
RUBROS:	MEDIDAS (M)			Area (M2)	VOLUMENES		Total
	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal	
REPLANTEO Y NIVELACIÓN	20.00	11.00		220.00			220.00
EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TIERRA	11.53	11.00	0.15		19.02	19.02	19.66
	11.00	0.20	0.27		0.27	0.27	
	11.00	0.10	0.07		0.07	0.07	
	19.70	0.15	0.22		0.22	0.22	
	19.70	0.15	0.09		0.09	0.09	
EXCAVACION DE ESTRUCTURAS MENORES							
COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL CON VIBROAPISONADOR	11.53	11.00	0.15		19.02	19.02	19.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUB BASE CLASE 3	19.70	10.70	0.17		35.83	35.83	35.83
ENCOFRADO - DESEN. MADERA	20.00	0.50	0.55	10.50			37.12
	20.00	0.25	0.40	6.50			
	11.00	0.25	0.50	4.13			
	11.00	0.40	0.50	4.95			
	0.80	6.00		9.60			
	1.20	0.40		0.96			
	0.60	0.40		0.48			
HORMIGÓN CICLÓPEO (50% P. H.S. FC=210 KG/CM2 - 50% INCLUYE ENL-MAS-PART VISTAS)	6.00	0.80	0.60		2.88	2.88	14.74
	6.00	0.60	0.40		1.44	1.44	
	19.70	0.49	0.41		3.91	3.91	
	19.70	0.49	0.28		2.70	2.70	
	11.00	0.48	0.46		2.40	2.40	
	11.00	0.50	0.26		1.40	1.40	
PISO DE CANCHA CON MALLA METÁLICA 4 MM (E=0.07)	20.00	11.00		220.00			220.00
PINTURA DE CANCHA	65.00	0.50	0.85		27.63	27.63	27.63
PARANTE PARA VOLEY TUBO HG POSTE 3" x 3.50 ML	2.00						2.00
MALLA PARA VOLEY	1.00						1.00



FISCALIZADOR

ING. ELIZABETH INGA



CONTRATISTA

ING. ERICK MANOBANDA



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÍNFIMA CUANTÍA

Acta de Entrega Recepción Ínfima Cuantía del proyecto, **“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA”**, entregado por el ING. ERICK MANOBANDA, previo orden de trabajo N.º 06-A-DOP-GADCG, de fecha 10 de mayo de 2022, emitida por la Dirección de OO.PP.MM. ING. GALO PATÍN.

En la ciudad de Guaranda a los 13 días del mes de julio del dos mil veinte y dos, comparece por una parte el ING. GALO PATÍN, Director de Obras Públicas Municipales (e), debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, la Ing. Elizabeth Inga en calidad de Observador - Fiscalizador de la entrega, y por otra parte el Ing. Erick Manobanda para el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA”**; en calidad de contratista, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado de los TRABAJOS y la cantidad solicitada a su vez como se ejecutó la obra y proceder a realizar la recepción de los trabajos realizados bajo los siguientes rubros:

RUBRO Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES - IMPORTES	
				ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1.53	220.00	336.60
2	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TIERRA	M3	5.83	19.66	110.89
3	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	7.55	0.00	0.00
4	COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL CON VIBROAPISONADOR	M3	0.33	19.02	6.28
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUB BASE CLASE 3	M3	24.06	35.83	760.74
7	ENCOFRADO - DESEN. MADERA	M2	7.37	37.12	273.57
9	HORMIGÓN CICLÓPEO (50% P. H.S. F'C=210 KG/CM2 - 50% INCLUYE ENL-MAS-PART VISTAS)	M3	83.70	14.74	1233.74
8	PISO DE CANCHA CON MALLA METÁLICA 4 MM (E=0.07)	M2	14.50	220.00	3190.00
10	PINTURA DE CANCHA	ML	0.58	27.63	16.02
11	PARANTE PARA VOLEY TUBO HG POSTE 3" x 3.50 ML	U	45.35	2.00	90.70
12	MALLA PARA VOLEY	U	11.04	1.00	11.04
TOTAL PARCIAL					6134.74
IVA 12%					736.17
TOTAL					6870.91





DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de orden de Trabajo N°: 10 de Mayo del 2022

Plazo: 20 días a partir de la Orden de Trabajo

Oficio de terminación de Trabajos: 27 de Mayo del 2022

Días Trabajados: 18 días, no existe mora

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante **OFICIO N° 04EM**, emitido el 13 de junio del 2022, por el Ing. ERICK MANOBANDA, contratista del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA”**, el cual informa que por motivos de salud y paralización del país por el paro nacional no se acercó a la firma del acta recepción, memoria de cálculo y planilla, por tal motivo se realiza el día de hoy trámite para proceder con el pago.

RECEPCIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de comisión, proceden a la inspección de los trabajos, con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de terminación de los trabajos, **“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA”**.


Quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción, los diferentes rubros componentes de la orden de trabajo se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el responderá por los vicios ocultos de los mismos según el tiempo que determinada la ley civil en consecuencia es de responsabilidad del contratista, **“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VÓLEY EN LA CIUDADELA MARCOPAMBA”**, hacer las correcciones a su costo.

Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando de total acuerdo entre las partes.

Atentamente,


Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OO.PP.MM (e)


Ing. Civil. Elizabeth Inga S
TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS


Ing. Erick Manobanda
CONTRATISTA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfono: (032) – 551088 – 551089
E – mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec
