

INFORME N° 005

RECORRIDO EN LA PARROQUIA SIMIATUG, GUANUJO Y SALINAS

De: Msc. Telésforo Martínez
Lic. Laura González
Ing. Juan Mena
CONCEJALES DEL CANTON GUARANDA

Para: Dr. Inti Yumbay Taris
ALCALDE DEL CANTON GUARANDA
Ing. Fernando Rea
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD-CG

Asunto: Informe de recorrido

Fecha: 3 de septiembre de 2025

INTRODUCCION:

En cumplimiento de las obligaciones que tenemos como concejales del cantón Guaranda, el día jueves 7 de agosto del 2025, nos trasladamos a la parroquia Simiátug, Salinas y Guanujo, para observar y constatar el avance de obras que la municipalidad del cantón Guaranda se encuentra desarrollando en beneficio de la población de esa parroquia.

1. De forma puntual, se realiza la inspección de las obras: ampliación de la vía Simiátug Mindina.
2. Participación en la sesión de presupuesto participativo, en Guanujo.
3. Instalación de césped sintético en la comunidad de Suropogyos y en la parroquia Salinas,
4. Verificación del proyecto del alcantarillado de la comunidad La Palma con los técnicos del MAATE y los contratistas, en la que observamos los avances de los trabajos que se vienen realizando en las comunidades de la zona, de esa manera brindamos dignidad, seguridad vial a nuestros productores.

OBJETIVO:


Verificar el avance de las distintas obras en ejecución en las parroquias de Simiátug, Salinas y Guanujo del cantón Guaranda, para posterior poner en conocimiento de la autoridad máxima.

Guaranda
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Recibido. SGD.
18/09/2025
JB. 12:15

DETALLE DEL RECORRIDO

En el recorrido desarrollado se pudo constatar que los trabajos correspondientes avanzan, destacando la activa participación de la población beneficiaria. En el trabajo se encontró 3 volquetas pequeñas y una mula, además se encontró una cargadora frontal, una gallineta, un tanquero de agua, una moto niveladora y un rodillo con los compañeros responsables de cada maquinaria.

La Y Larca Pamba base y súbbase.

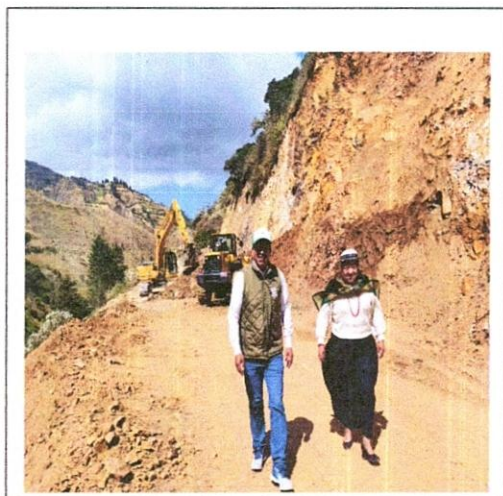

Comunidad Suropogyos




CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE COMIDA EN EL SECTOR DE LOS AGACHADITOS, DENTRO DE LA CIUDAD DE GUARANDA.



Parroquia Salinas, la comunidad La Palma

Nuevo mercado La Palma Salinas

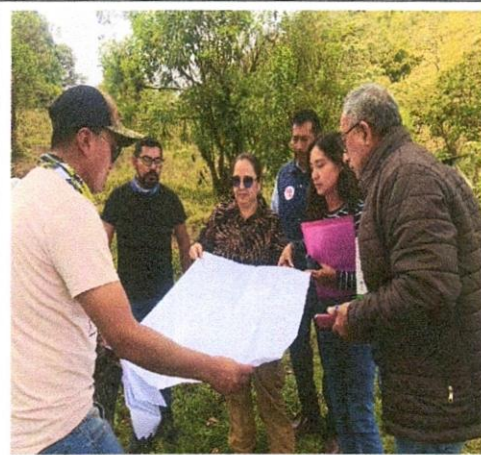

CONCLUSIONES:

- Se observa un avance aproximado de más 10 kilómetros de desanche de la vía.
- En la comunidad de Suropogyos la cancha sintética está finalizada a igual que la cancha de uso múltiple.
- En salinas, el mercado está en la parte final, falta los últimos acabados.
- En el centro de Guaranda inicia la obra de los agachaditos.

RECOMENDACIONES:


- Es importante poner más maquinaria grande para poder rápidamente terminar el desanche de la vía Simiátug - Mindina, de la misma manera las cajoneras se deben seguir llenando, porque el invierno se aproxima.
- En la comunidad de Suropogyos se necesita dar una mano de pintura al graderío y espacios más visibles de la cancha, sería importante poner mensajes o logotipos en la pared.
- En la comunidad La Palma de Salinas, necesitamos terminar el mercado porque falta las ventas en la una parte de la construcción,
- Con referencia al sistema del alcantarillado y agua potable de la comunidad, necesitamos dar seguimiento al contratista de los estudios de la obra.

Atentamente;



MSc. Telésforo Martínez

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA



Lic. Laura González

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Ing. Juan Mena

CONCEJAL ALTERNO
