

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio- 950 - FCGOR-GADCG

Guaranda, 07 de noviembre de 2022

Ingeniero
ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ.
Director de Obras Públicas Municipales

Presente:

En mi calidad de fiscalizador del proyecto, informo a usted que se ha realizado el control de la ejecución de los trabajos **"READOQUINADO EN SECTORES DE LA CALLE SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA"**, trabajos que se han ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la orden de trabajo y las recomendaciones de la fiscalización, por lo que se ha procedido a cuantificar los diferentes rubros y elaborar la planilla única, que corresponde al periodo del 24 octubre al 2 de noviembre del 2022 de acuerdo a los rubros y cantidades de obra que se detallan en los formatos que se anexan y cuyo monto asciende a la cantidad de **USD 5.542,88 MAS EL IVA (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS, 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)**


PLANILLA UNICA:	CANTIDAD TRABAJADA
VALOR PLANILLA UNICA:	\$ 5.542,88
TOTAL	\$ 5.542,88

Por lo anotado, informo a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla única, a nombre del maestro: Víctor Avilés Chacán, contratista y responsable de los trabajos, según orden de trabajo No.-20-DOP-GADCG suscrito el 24 de octubre del 2022.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.
Atentamente;


ING. CARLOS OROZCO RUIZ.

Fiscalizador Municipal


GUARANDA
OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO

16:26 07 NOV 2022


FIRMA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS
ÍNFIMA CUANTÍA**

Acta de Entrega y Recepción Definitiva de la ejecución de los trabajos de: **“READOQUINADO EN SECTORES DE LA CALLE SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA”** ejecutado por el maestro: Víctor Avilés Chacán, previa orden de trabajo No.- 20-DOP-GADCG del 24 de octubre del 2022 emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los siete días del mes de noviembre del 2022, comparece por una parte el Ing. **Fabián Vasconez Chávez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el Ing. **Carlos Orozco Ruiz** en calidad de Fiscalizador de Los trabajos, y por otra parte el maestro: Víctor Avilés Chacán **en calidad de contratista de los trabajos**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra la obra y proceder a realizar la recepción definitiva de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de **Alcalde del Cantón** y por otra parte el maestro: Víctor Avilés Chacán en calidad de contratista, proceden a realizar los trabajos: **“READOQUINADO EN SECTORES DE LA CALLE SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA”** con la partida presupuestaria N° 00.00.003.361.750101.000.02.01.0.100 correspondiente “EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA”, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	Maestro: Víctor Avilés Chacán
Objeto del contrato:	“READOQUINADO EN SECTORES DE LA CALLE SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA”
Valor presupuesto original:	USD 5.543,98 DOLARES SIN EL IVA
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-20-DOP-GADCG de trabajo del 24 de octubre del 2022
Plazo:	10 días calendario, desde la orden de trabajo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN. –

La fiscalización informa que los trabajos objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas, contractuales; con resultados satisfactorios, emitiendo la fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción provisional, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación:

RUBROS Y CANTIDADES TRABAJADAS

No.-	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACADA DE ADOQUIN LIMPIEZA	M2	1.274.81	1.08	1.376.79
2	ADOQUINADO	M2	1.274.81	3.08	3.926.41
3	RELLENO	M3	12.59	4.20	52.88
4	ALZADA DE POZO	U	1.00	15.13	15.13
5	ALZADA DE SUMIDERO	U	2.00	10.46	20.92
6	ARREGLO BORDILLO	ML	16.00	4.99	79.84
7	H. SIMPLE 210 KG/CM2	M3	0.64	110.79	70.91
TOTAL DOLARES					5,542.88

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

El Valor trabajado es de \$ 5.542,88 dólares

IVA= \$ 665,15 dólares

Total + IVA= \$ 6.208,03 dólares

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo contratado:	10 días
Fecha de inicio trabajos:	orden de trabajo No.-20-DOP-GADCG del 24 de octubre del 2022
Fecha de entrega de la obra:	2 de noviembre de 2022
Tiempo empleado:	10 días entrega de trabajos con oficio s/n de fecha 2 de noviembre del 2022 del maestro Víctor Avilés Chacán



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTO: RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción definitiva, una vez que se ha verificado que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADC-G ya que ha sido ejecutada de acuerdo a las, especificaciones generales y técnicas.


De conformidad en lo establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos: **"READOQUINADO EN SECTORES DE LA CALLE SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA"** quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción Definitiva, los diferentes trabajos se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos **"READOQUINADO EN SECTORES DE LA CALLE SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA"**.

SEXTA: OBSERVACIONES: Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción o vicio oculto que aparecieran en los trabajos, de acuerdo a la ley civil.

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. -

Ninguna devolución de garantía.


Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, a los dos días del mes de noviembre del dos mil veinte y dos.



ING. FABIAN VASCONEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OO. PP. MM.



ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR



MAESTRO: VICTOR AVILES CHACAN
CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio - 951-DPF-GADCG

Guaranda, 7 de noviembre de 2022

INGENIERO
ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ.
Director de Obras Públicas - GADCG

De mi consideración:

Presente.

Dando cumplimiento a la orden de trabajo No.-20-DOP-GADCG del 24 de octubre del 2022, se informa sobre el control y fiscalización de la ejecución de la ejecución del "READOQUINADO EN SECTORES DE LAS CALLES SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" Contratista: maestro Víctor Avilés Chacán se indica lo siguiente:

INFORME DE FISCALIZACION

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	Maestro: Víctor Avilés Chacán
Objeto del contrato:	"READOQUINADO EN SECTORES DE LA CALLE SOLANDA, SUCRE Y ESPEJO DE LA CIUDAD DE GUARANDA"
Valor presupuesto original:	USD 5.543,98 DOLARES SIN EL IVA
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-20-DOP-GADCG de trabajo del 24 de octubre del 2022
Plazo:	10 días calendario, desde la orden de trabajo

ANTECEDENTES. –

El contratista con oficio s/n de fecha 2 de noviembre del 2022 entrega la obra para su trámite y firma del acta recepción definitiva es una obra por administración directa:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RUBROS Y CANTIDADES TRABAJADAS

No.-	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACADA DE ADOQUIN LIMPIEZA	M2	1.274.81	1.08	1.376.79
2	ADOQUINADO	M2	1.274.81	3.08	3.926.41
3	RELLENO	M3	12.59	4.20	52.88
4	ALZADA DE POZO	U	1.00	15.13	15.13
5	ALZADA DE SUMIDERO	U	2.00	10.46	20.92
6	ARREGLO BORDILLO	ML	16.00	4.99	79.84
7	H. SIMPLE 210 KG/CM2	M3	0.64	110.79	70.91
TOTAL DOLARES					5,542.88

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

El Valor trabajado es de \$ 5.542,88 dólares

IVA= \$ 665,15 dólares

Total + IVA= \$ 6.208,03 dólares

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -


Plazo contratado:	10 días
Fecha de inicio trabajos:	orden de trabajo No.-20-DOP-GADCG del 24 de octubre del 2022
Fecha de entrega de la obra:	2 de noviembre de 2022
Tiempo empleado:	10 días entrega de trabajos con oficio s/n de fecha 2 de noviembre del 2022 del maestro Víctor Avilés Chacán

OBSERVACIONES y CONCLUSIONES:

Los trabajos de re adoquinado en la calle Solanda entre Pichincha y John F Kennedy, calle Solanda entre Pichincha y Sucre, calle Sucre entre Solanda y General Salazar, calle Espejo y Antigua Colombia esquina se realiza en un 100%.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

 DIRECTOR OO.PP.MM FABIAN VASCONEZ CHAVEZ	 FISCALIZADOR ING. CARLOS OROZCO RUIZ	 CONTRATISTA Sr. VICTOR AVILES CHACAN
--	--	--

Trabajos de readoquinado en la calle Solanda entre la Pichincha y John F Kennedy

cantidad	distancia (m)	altura (m)	espesor (cm)	area (total)	rubro	ubicacion
1	12,90	1,29		16,64	Readoquinado	acera
1	20,00	7,02		140,40		calzada
1	20,00	7,04		140,80		calzada
1	13,45	6,97		93,75		calzada
1	3,30	2,00		6,60		calzada
1	3,60	0,90		3,24		calzada
				401,43		
1	12,90	1,30	0,20	3,35	Relleno comp	acera
1	14,00	3,30	0,20	9,24		calzada
				12,59		
1	16,00				Arreglo en bord	acera
1	2,90	0,12	0,06	0,02	Hormigon S	Filos rejillas

Cuadro de cantidades en general

Readoquinado 401,43 m2

Relleno compactado 12,59 m3

Arreglo en bordillos 12,90 ml

Filos en rejillas H.S 0,02 M3

Trabajos de readoquinado en la calle Solanda entre Pichincha y Sucre

1	3,50	1,40		2,45	Readoquinado	calz triangulo
1	2,50	1,40		1,75		calz triangulo
1	20,00	5,87		117,40		calzada
1	20,00	5,87		117,40		calzada
1	20,00	5,85		117,00		calzada
1	14,75	5,85		86,29		calzada
				442,29		
1	2 U				Alzada sumideros	
1	5,85	0,15	0,12	0,11	Hormigon S	berma

Cuadro de cantidades en general

Readoquinado 442,29 m2

Hormigon S 0,11 M3

Trabajos de readoquinado en la calle Sucre entre Solanda y General Salazar

1	1,50	0,80		1,20	Readoquinado	calzada
1	1,10	0,80		0,88		calzada
1	2,30	0,55		1,27		calzada
1	10,00	3,10		31,00		calzada
1	20,00	3,20		64,00		calzada
1	20,00	3,30		66,00		calzada
1	20,00	3,40		68,00		calzada
1	10,00	3,40		34,00		calzada
1	9,40	2,62		24,63		calzada
				290,97		
1	4,50	0,15	0,15	0,10	H S	Berma
1	0,90	0,10	0,08	0,01		Pozos remates
2	1,30	0,10	0,08	0,02		sumideros remates
				0,13		
1	1 U				Alzada de pozo	calzada

Cuadro de cantidades en general

Readoquinado 290,97 M2

Hormigon S 0,10 M3

Alzada de pozos 1U

Trabajos de readoquinado en la calle Espejo entre Antigua Colombia esquinera

1	19,00	4,00		76,00	Readoquinado	calzada
1	12,50	2,00		25,00		calzada
1	11,00	2,60		28,60		calzada
1	3,50	2,00		7,00		calzada
1	0,40	0,40		0,16		calzada
1	1,20	1,60		1,92		calzada
1	1,20	1,20		1,44		calzada
				140,12		
1	2,50	0,15	0,08	0,03	H S	Rejilla
2	1,90	0,1	0,08	0,03		pozo
1	15,90	0,15	0,08	0,19		Rejilla
1	12,30	0,15	0,08	0,15		Rejilla
				0,40		

Cuadro de cantidades en general

Readoquinado 140,12 m2

CUADRO DE CANTIDADES TOTALES

READOQUINADOS 1.274,81 M2

RELLENO COMPACTADO 12,59 M3

ARREGLO DE BORDILLOS 16,00 ML

HORMIGON S 0,65 M3

ALZADA DE POZOS 1,00 U

ALZADO DE SUMIDEROS 2 U

FISCALIZADOR
ING: CARLOS OROZCO

CONTRATISTA
SR: VICTOR AVILES



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Trabajos de readoquinado en la calle Solanda entre la Pichincha y John F Kennedy

Readoquinado



Readoquinado



Relleno compactado



Relleno compactado



Relleno compactado



Arreglo en bordillos



Gu

Victor J. J. J. J.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Trabajos de readoquinado en la calle Solanda entre Pichincha y Sucre

Alzada de sumideros



Hormigon simple berma

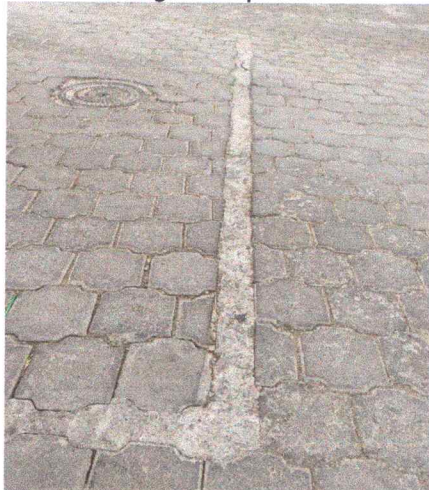

Readoquinado



Trabajos de readoquinado en la calle Sucre entre Solanda y General Salazar


Readoquinado



Readoquinado



Readoquinado

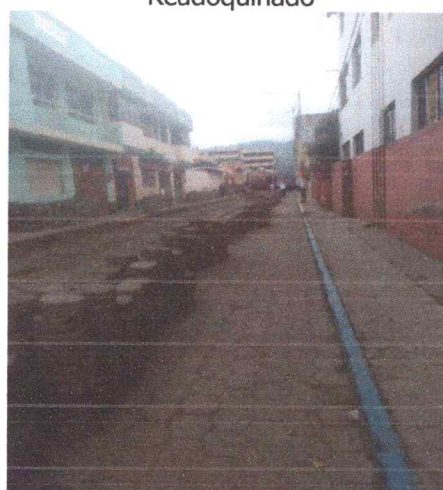

Trabajos de readoquinado en la calle Espejo entre Antigua Colombia esquinera

Readoquinado



FISCALIZADOR
ING. CARLOS OROZCO

CONTRATISTA
SR. VICTOR AVILES

